
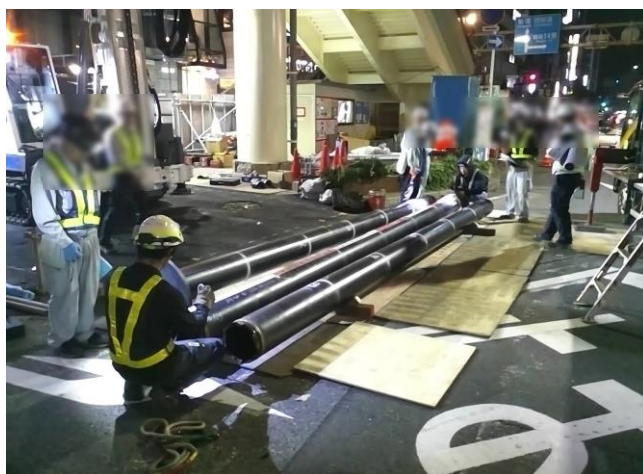
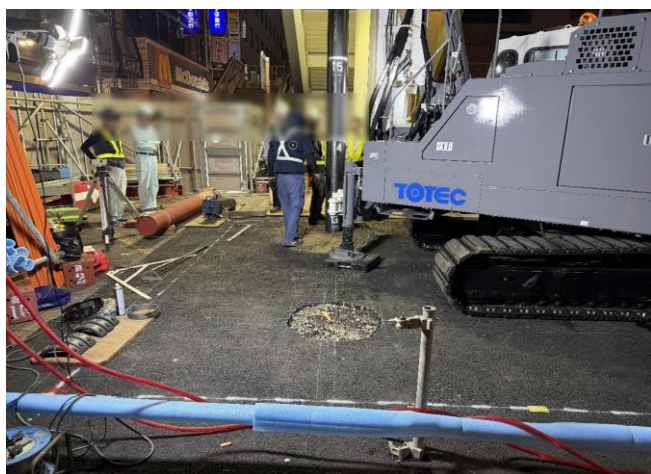


J R 津田沼駅北口駅前広場昇降施設設置工事

工事進捗状況

令和8年7月21日

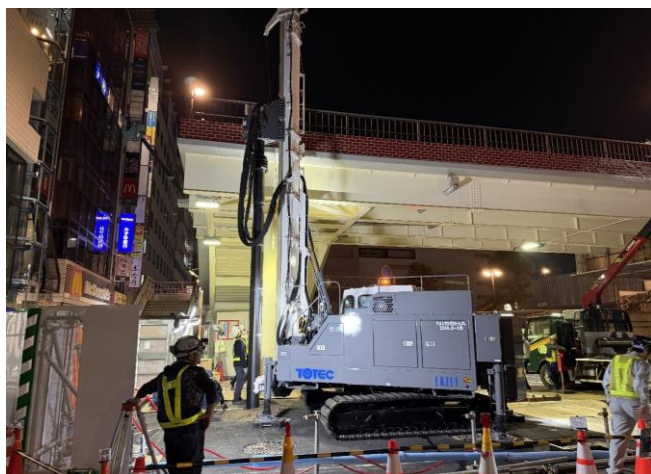

工事スケジュール

※ 工事工程は予定であり、状況により変更することがあります。

	令和 8 年												令和 9 年		
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
準備工		現地確認	済		済										
道路施設移設				移設		作業中									
仮土留工					準備		仮土留設置								
E V 工事		エレベーター工場製作										エレベーター設置			
電気設備工事						作業中	電気設備工場製作等				設置				
基礎工事					準備	基礎杭・コシ基礎									
デッキ改築工									デッキ接続						
鉄骨工事				エレベーター柱 工場製作						柱設置					
外装工事					エレベーター外装 工場製作							外装設置			
道路復旧工												道路復旧			

工場作業 昼 工事 夜 工事

※「基礎工事」「基礎杭」とは…

エレベーターを支えるための基礎および基礎杭を設置しています。

本工事では直径267.4ミリメートル、長さ18メートルの鋼管杭を4本打ち込み、エレベーターを支えます。
