


習志野市鷺沼放流幹線建設工事 工事状況 令和3年3月末 進捗率50.7%



令和3年3月末現在

No.2立坑設置工 (掘削・山留)

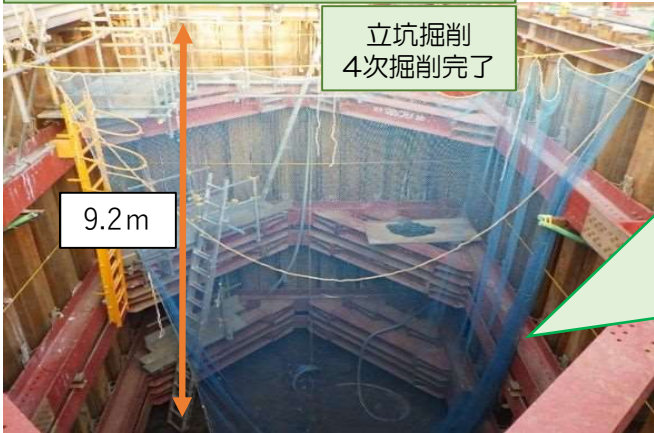

立坑掘削  
4次掘削完了

9.2m

3月末現在  
立坑の3段梁設置完了。  
現地盤から深さ9.2m掘削完了。  
底版コンクリート打設完了。



立坑設備工

9.6m

土砂ホッパー(左)  
裏込めプラント(右)  
シールド設備設置完了。

ゲート位置図：2箇所



新ゲート設置箇所



4月末に  
新ゲートからシールドマシンが出入りします。  
車両搬入時、ご迷惑をおかけしますが、ご協力よろしくお願いたします。
