

# 習志野市鷺沼放流幹線建設工事 工事状況 令和4年6月末 進捗率87.8%

令和4年6月末現在



## 一次覆工:シールド掘進状況


坑内写真:切羽部



坑内写真:800m地点



## No.2発進立坑 作業基地状況

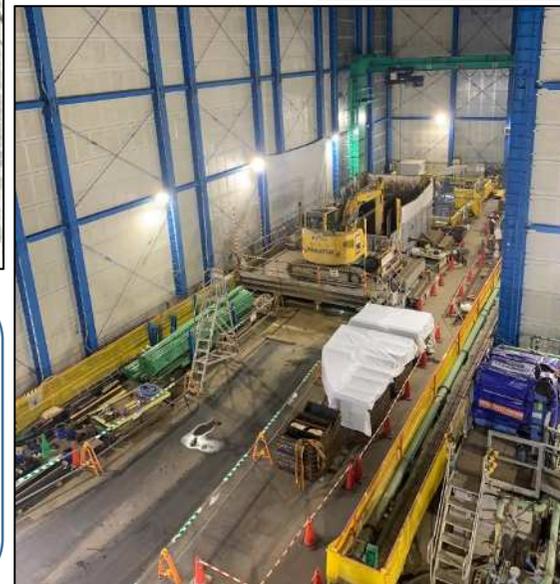

引き続き、シールド掘進工事を行っております。

約10m/日の進捗にて掘進しています。

○令和4年9月中旬に到達予定です。

車両の搬入出時・現場周辺には交通誘導員を配置しております。

ご迷惑をお掛けしますが  
ご協力よろしくお願いいたします。

## 【シールド機現在地】

- ・6月30日現在  
習志野市鷺沼5-12付近を掘進中
- ・現在、974mまで掘進完了  
(残り380m)
