


JR 津田沼駅・新京成新津田沼駅周辺地区 道路特定事業計画図 (1/2)

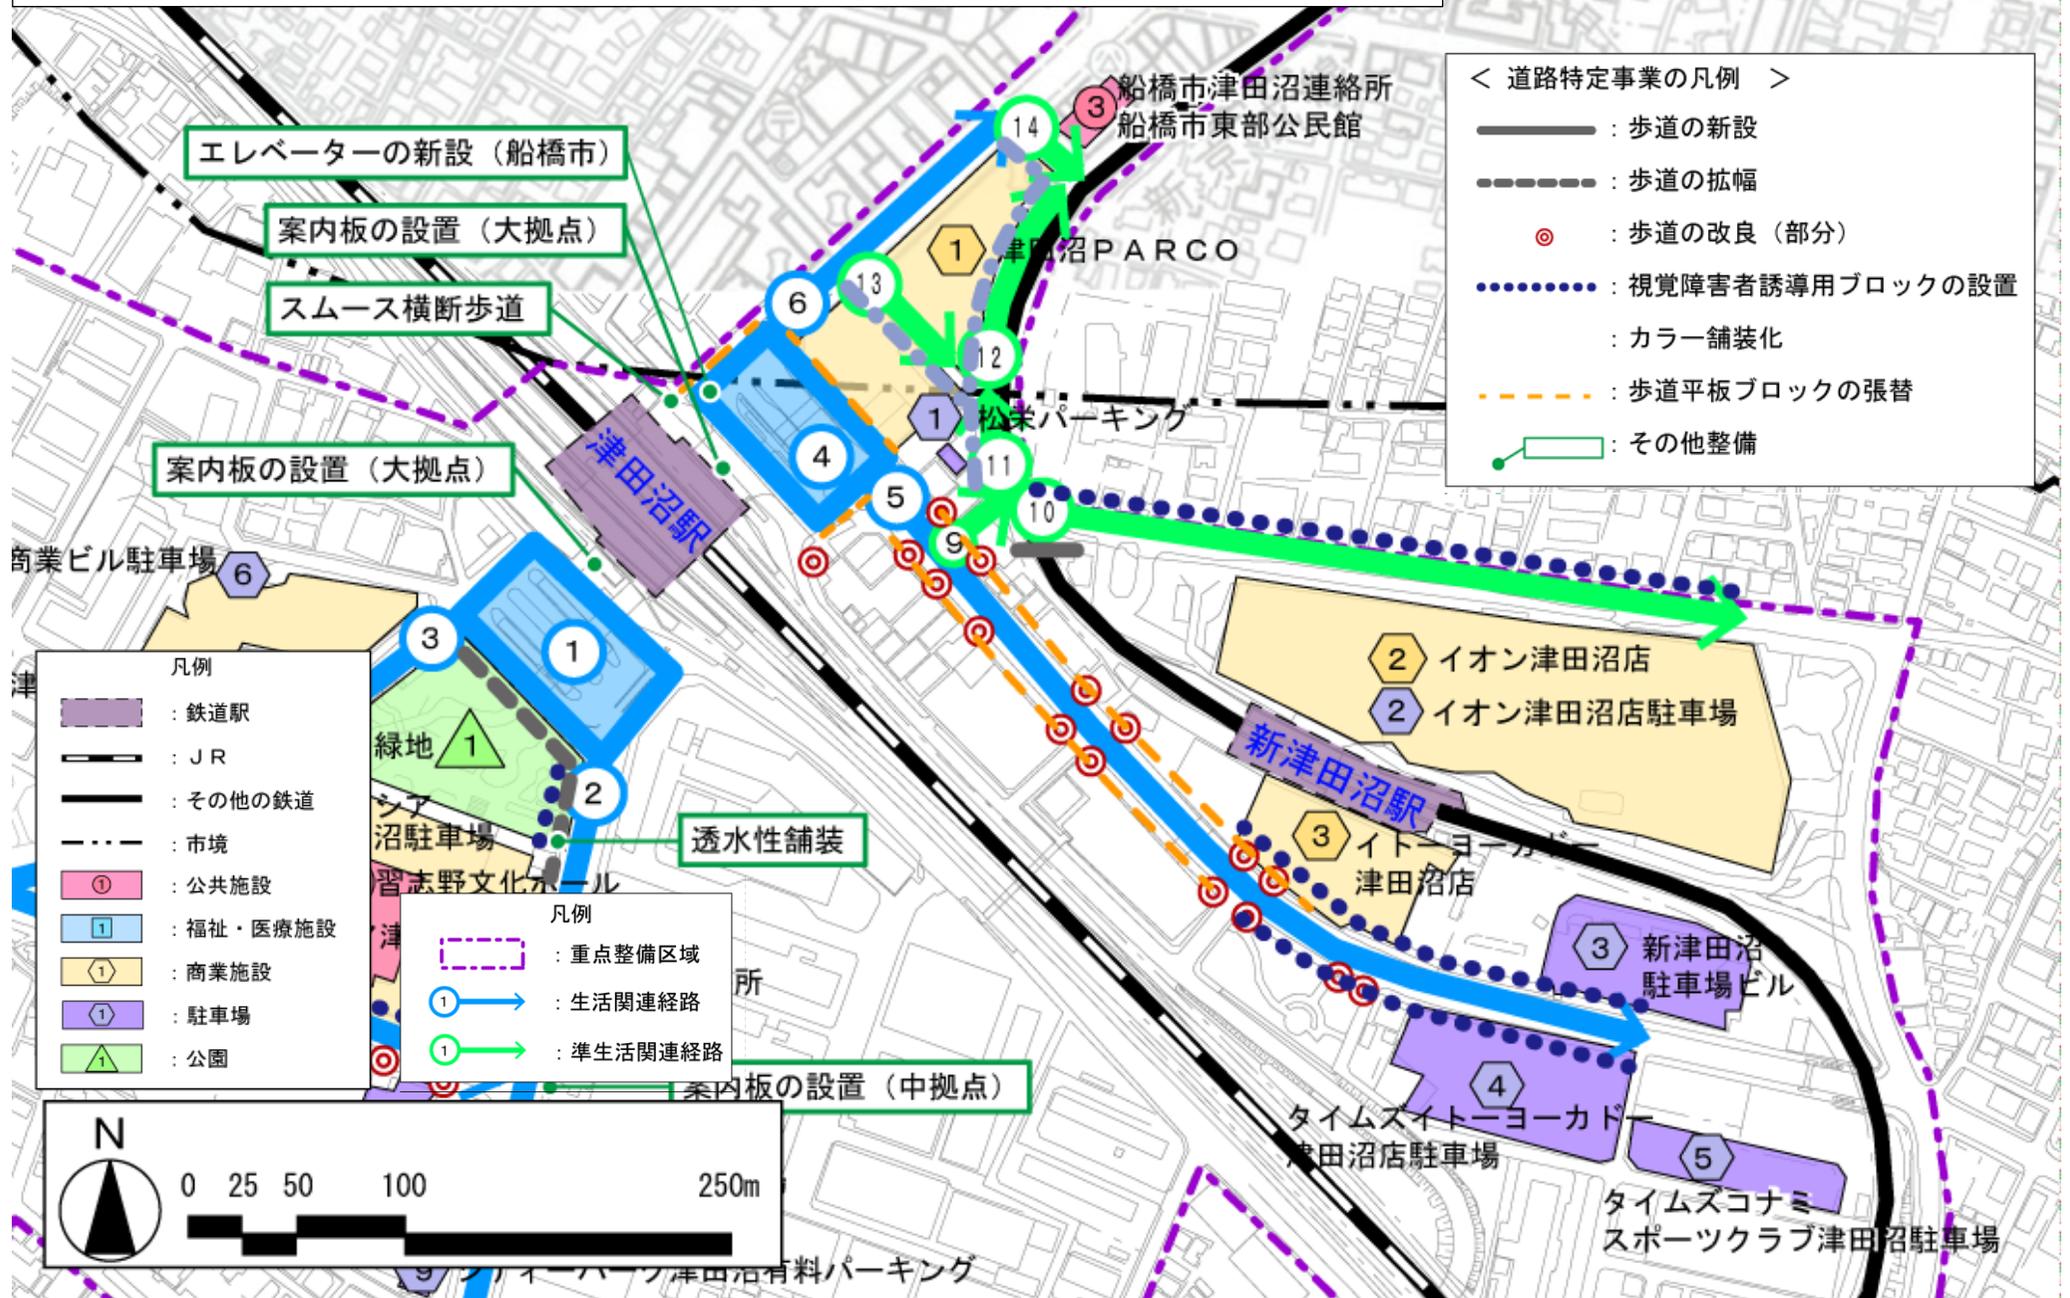


JR 津田沼駅・新京成新津田沼駅周辺地区 道路特定事業計画図 (2/2)

< 道路特定事業の凡例 >

- : 歩道の新設
- - - - : 歩道の拡幅
- ⊙ : 歩道の改良 (部分)
- : 視覚障害者誘導用ブロックの設置
- : カラー舗装化
- . - . : 歩道平板ブロックの張替
- : その他整備

- ### 凡例
- : 鉄道駅
 - : JR
 - : その他の鉄道
 - - - : 市境
 - ① : 公共施設
 - ① : 福祉・医療施設
 - ① : 商業施設
 - ① : 駐車場
 - ① : 公園

- ### 凡例
- : 重点整備区域
 - ① : 生活関連経路
 - ① : 準生活関連経路



習志野市バリアフリー移動等円滑化特定事業計画進捗状況調査表(道路特定事業計画)

A: 事業完了・計画どおり進行
 B: 概ね計画どおり進行
 C: 進捗しているが努力を要する
 D: 未着手
 —: 計画実施時期未到来

<JR津田沼駅・新京成新津田沼駅周辺地区>

No.	重点整備地区	路線番号	事業区間		事業者	事業内容	事業量 (延長/箇所数)	特定事業計画での実施予定時期		実施時期 (年度)							令和6年度の具体的な 取組内容及び課題						
			始点	終点				着手 予定	完了 予定	前期				後期									
										27	28	29	30	元	2	3		4	5	6	7		
1	イ	1	JR津田沼駅南口駅前広場	JR津田沼駅南口駅前広場	習志野市(街路建設課)	歩道の拡幅(津田沼公園北側)	96m	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	JR津田沼駅南口再開発にあわせて整備のため			
2	イ				習志野市(街路建設課)	案内板の設置(大拠点)	1箇所	前期	前期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	JR津田沼駅南口再開発にあわせて整備のため		
3	イ				習志野市(道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D	A	A		定期的な市内パトロール実施		
3	イ				習志野市(防犯安全課)	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		JR津田沼駅南口 撤去台数 自転車:73 原付:1	
4	イ	2	JR津田沼駅南口駅前広場	習志野郵便局前	習志野市(街路建設課)	歩道の拡幅(津田沼公園東側)	44m	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	JR津田沼駅南口再開発にあわせて整備のため			
5	イ				習志野市(街路建設課)	視覚障害者誘導用ブロックの設置	200m	前期	前期	—	—	—	C	C	A								
6	イ				習志野市(街路建設課)	案内板の設置	中拠点1箇所 小拠点1箇所	前期	前期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	JR津田沼駅南口再開発にあわせて整備のため	
7	イ	3	JR津田沼駅南口駅前広場	Loharu 津田沼前	習志野市(道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D	A	A	定期的な市内パトロール実施			
7	イ				習志野市(防犯安全課)	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		JR津田沼駅南口 撤去台数 自転車:73 原付:1	
8	イ	4	JR津田沼駅北口駅前広場	JR津田沼駅北口駅前広場	習志野市(街路建設課)	歩道の改良(部分)	1箇所	前期	前期	C	C	C	C	C	C	A							
9	イ					歩道平板ブロックの張替	800㎡	前期	前期	C	A												
10	イ					案内板の設置(大拠点)	1箇所	前期	前期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	JR津田沼駅南口再開発にあわせて整備のため
12	イ					スムーズ横断歩道	1箇所	前期	前期	—	C	C	C	A									
11	イ				習志野市(道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D	A	A			定期的な市内パトロール実施	
11	イ				習志野市(防犯安全課)	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		JR津田沼駅北口 撤去台数 自転車:341 原付:17	
13	イ				船橋市	エレベーターの設置	1基	前期	前期	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C		令和6年4月15日に令和6年度 JR津田沼駅北口駅前広場エレベーター施設設置に伴う施行協定書を締結し、習志野市が行った予備設計、測量、地質調査等の費用負担を行った。	
13	イ				習志野市(街路建設課)	エレベーターの設置	1基	前期	前期	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	B		土質調査、予備設計を実施	
14	イ	5	JR津田沼駅北口駅前広場	イトーヨーカドー 津田沼店前	習志野市(街路建設課)	歩道の改良(部分)	15箇所	前期	前期	C	A												
15	イ				習志野市(街路建設課)	歩道平板ブロックの張替	2,200㎡	前期	前期	B	A												
16	イ				習志野市(街路建設課)	視覚障害者誘導用ブロックの設置	550m	前期	前期	C	A												
17	イ				習志野市(道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D	A	A		定期的な市内パトロール実施		
17	イ				習志野市(防犯安全課)	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		JR津田沼駅北口 撤去台数 自転車:341 原付:17	

No.	重点整備地区	路線番号	事業区間		事業者	事業内容	事業量 (延長/箇所数)	特定事業計画での 実施予定時期		実施時期 (年度)							令和6年度の具体的な 取組内容及び課題						
			始点	終点				着手 予定	完了 予定	前期				後期									
										27	28	29	30	元	2	3		4	5	6	7		
18	イ	6	JR津田沼駅北口 駅前広場	津田沼PARCO前	千葉県	歩きやすい歩行空間を維持するための 継続的な改善を行う	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	パトロールによる確認及び、修繕			
19	イ					案内板の設置の検討	—	継続		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	周辺に県管理案内施設等が無い場合、現在設置 予定なし	
20	イ	7	Loharu 津田沼店前	習志野文化ホール前	習志野市 (街路建設課)	歩道の改良(部分)	5箇所	前期	前期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	令和7年度以降に実施していく予定			
21	イ					視覚障害者誘導用ブロックの設置	187m	前期	前期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	令和7年度以降に実施していく予定	
22	イ					習志野市 (道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D	A	A		定期的な市内パトロール実施	
22	イ					習志野市 (防犯安全課)	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		JR津田沼駅南口 撤去台数 自転車:73 原付:1
23	イ	8	津田沼中央 総合病院前	津田沼中央 総合病院前	習志野市 (街路建設課)	視覚障害者誘導用ブロックの設置	15m	前期	前期	C	A	/	/	/	/	/	/	/	/				
24	イ					習志野市 (道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D	A	A		定期的な市内パトロール実施	
24	イ					習志野市 (防犯安全課)	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		JR津田沼駅南口 撤去台数 自転車:73 原付:1
25	イ	9	三菱東京 UFJ銀行前	—	習志野市 (道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D	A	A	定期的な市内パトロール実施			
25	イ					習志野市 (防犯安全課)	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		JR津田沼駅北口 撤去台数 自転車:341 原付:17
26	イ	10	イオン津田沼店前	—	習志野市 (街路建設課)	視覚障害者誘導用ブロックの設置	326m	前期	前期	—	—	—	—	—	—	—	A	/	/				
27	イ					習志野市 (道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D	A	A		定期的な市内パトロール実施	
27	イ					習志野市 (防犯安全課)	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		JR津田沼駅北口 撤去台数 自転車:341 原付:17
28	イ	11	三菱東京 UFJ銀行前	津田沼PARCO前	習志野市 (街路建設課)	カラー舗装化など	41m	前期	前期	—	—	—	—	—	A	/	/	/	/				
29	イ					習志野市 (道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D	A	A		定期的な市内パトロール実施	
29	イ					習志野市 (防犯安全課)	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		JR津田沼駅北口 撤去台数 自転車:341 原付:17
30	イ	12	津田沼PARCO 東側	—	船橋市	カラー舗装化	107m	前期	前期	D	D	D	C	C	A	A	A	A		外側線の設置、路肩部カラー舗装(緑色) 工事完了(令和2年度)			
31	イ	13	津田沼PARCO	—	船橋市	カラー舗装化	78m	前期	前期	D	D	D	C	C	A	A	A	A		外側線の設置、路肩部カラー舗装(緑色) 工事完了(令和2年度)			
32	イ	14	津田沼PARCO 北側	—	船橋市	カラー舗装化	41m	前期	前期	D	D	D	C	C	A	A	A	A		外側線の設置、路肩部カラー舗装(緑色) 工事完了(令和2年度)			
33	イ	15	奏の杜フォルテ前	谷津近隣公園	習志野市 (道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	A	A	A		定期的な市内パトロール実施		
33	イ					習志野市 (防犯安全課)	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		整理地区域外のため放置自転車等の連絡があっ た場合に職員が撤去
34	イ					習志野市 (街路建設課)	視覚障害者誘導用ブロックの設置	280m	前期	前期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	令和7年度以降に実施していく予定

京成津田沼駅周辺地区 道路特定事業計画図

< 道路特定事業の凡例 >

-  : 歩道の改良（部分）
-  : その他整備

凡例

-  : 重点整備区域
-  : 生活関連経路
-  : 準生活関連経路


凡例

-  : 鉄道駅
-  : JR
-  : その他の鉄道
-  : 市境
-  : 公共施設
-  : 福祉・医療施設
-  : 商業施設
-  : 駐車場
-  : 公園

N



0 25 50 100m

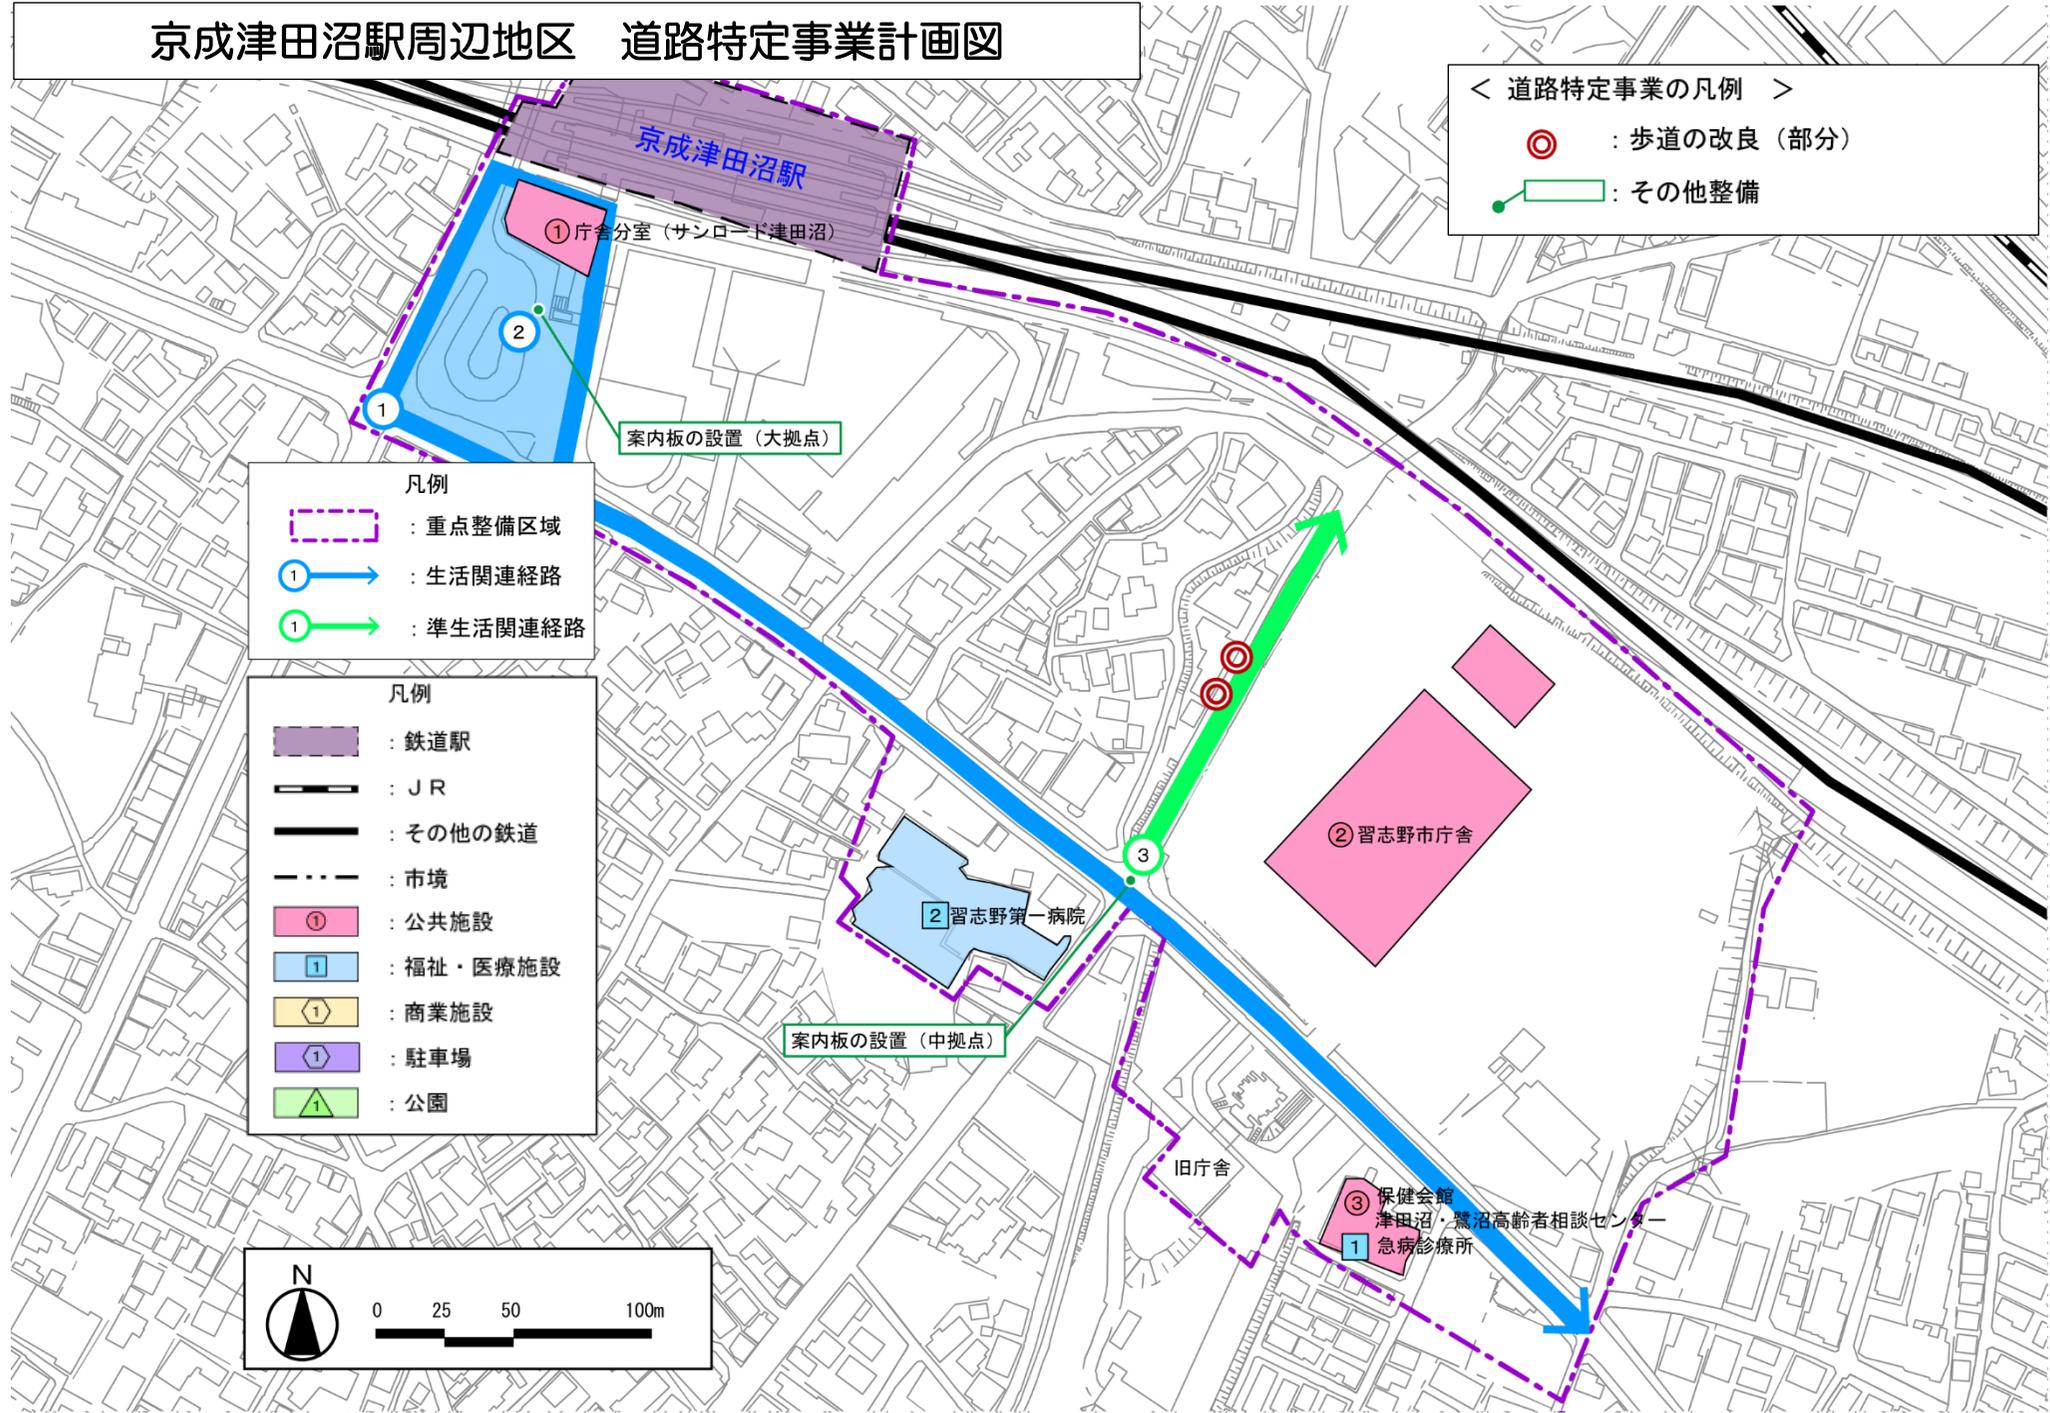



習志野市バリアフリー移動等円滑化特定事業計画進捗状況調査表(道路特定事業計画)

A: 事業完了・計画どおり進行
 B: 概ね計画どおり進行
 C: 進捗しているが努力を要する
 D: 未着手
 —: 計画実施時期未到来

<京成津田沼駅周辺地区>

No.	重点整備地区	路線番号	事業区間		事業者	事業内容	事業量 (延長/箇所数)	特定事業計画での 実施予定時期		実施時期 (年度)											令和6年度の具体的な 取組内容及び課題			
			始点	終点				着手 予定	完了 予定	前期					後期									
										27	28	29	30	元	2	3	4	5	6	7				
35	□	1	京成津田沼駅 南口駅前広場	新庁舎前	習志野市 (街路建設課)	案内板の設置(中拠点)	1箇所	前期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	令和7年度以降に実施していく予定		
37	□				習志野市 (街路建設課)	新庁舎建設の状況にあわせた歩道の バリアフリー整備																	令和7年度以降に実施していく予定	
36	□				習志野市 (道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続				A	A	A	A	A	D	D	D	A	A			定期的な市内パトロール実施
36	□				習志野市 (防犯安全課)	放置自転車の撤去	—	継続				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			京成津田沼駅 撤去台数 自転車:90 原付:1
38	□	2	京成津田沼駅 南口駅前広場	—	習志野市 (街路建設課)	案内板の設置(大拠点)	1箇所	前期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	令和7年度以降に実施していく予定		
39	□				習志野市 (道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続				A	A	A	A	A	D	D	D	A	A			定期的な市内パトロール実施
39	□				習志野市 (防犯安全課)	放置自転車の撤去	—	継続				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			京成津田沼駅 撤去台数 自転車:90 原付:1
40	□	3	習志野第一病院	保健会館 (移転前)	習志野市 (街路建設課)	歩道の改良(部分)	2箇所	前期	前期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
41	□				習志野市 (道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続				A	A	A	A	A	D	D	D	A	A			定期的な市内パトロール実施
41	□				習志野市 (防犯安全課)	放置自転車の撤去	—	継続				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			京成津田沼駅 撤去台数 自転車:90 原付:1

JR 新習志野駅周辺地区 道路特定事業計画図

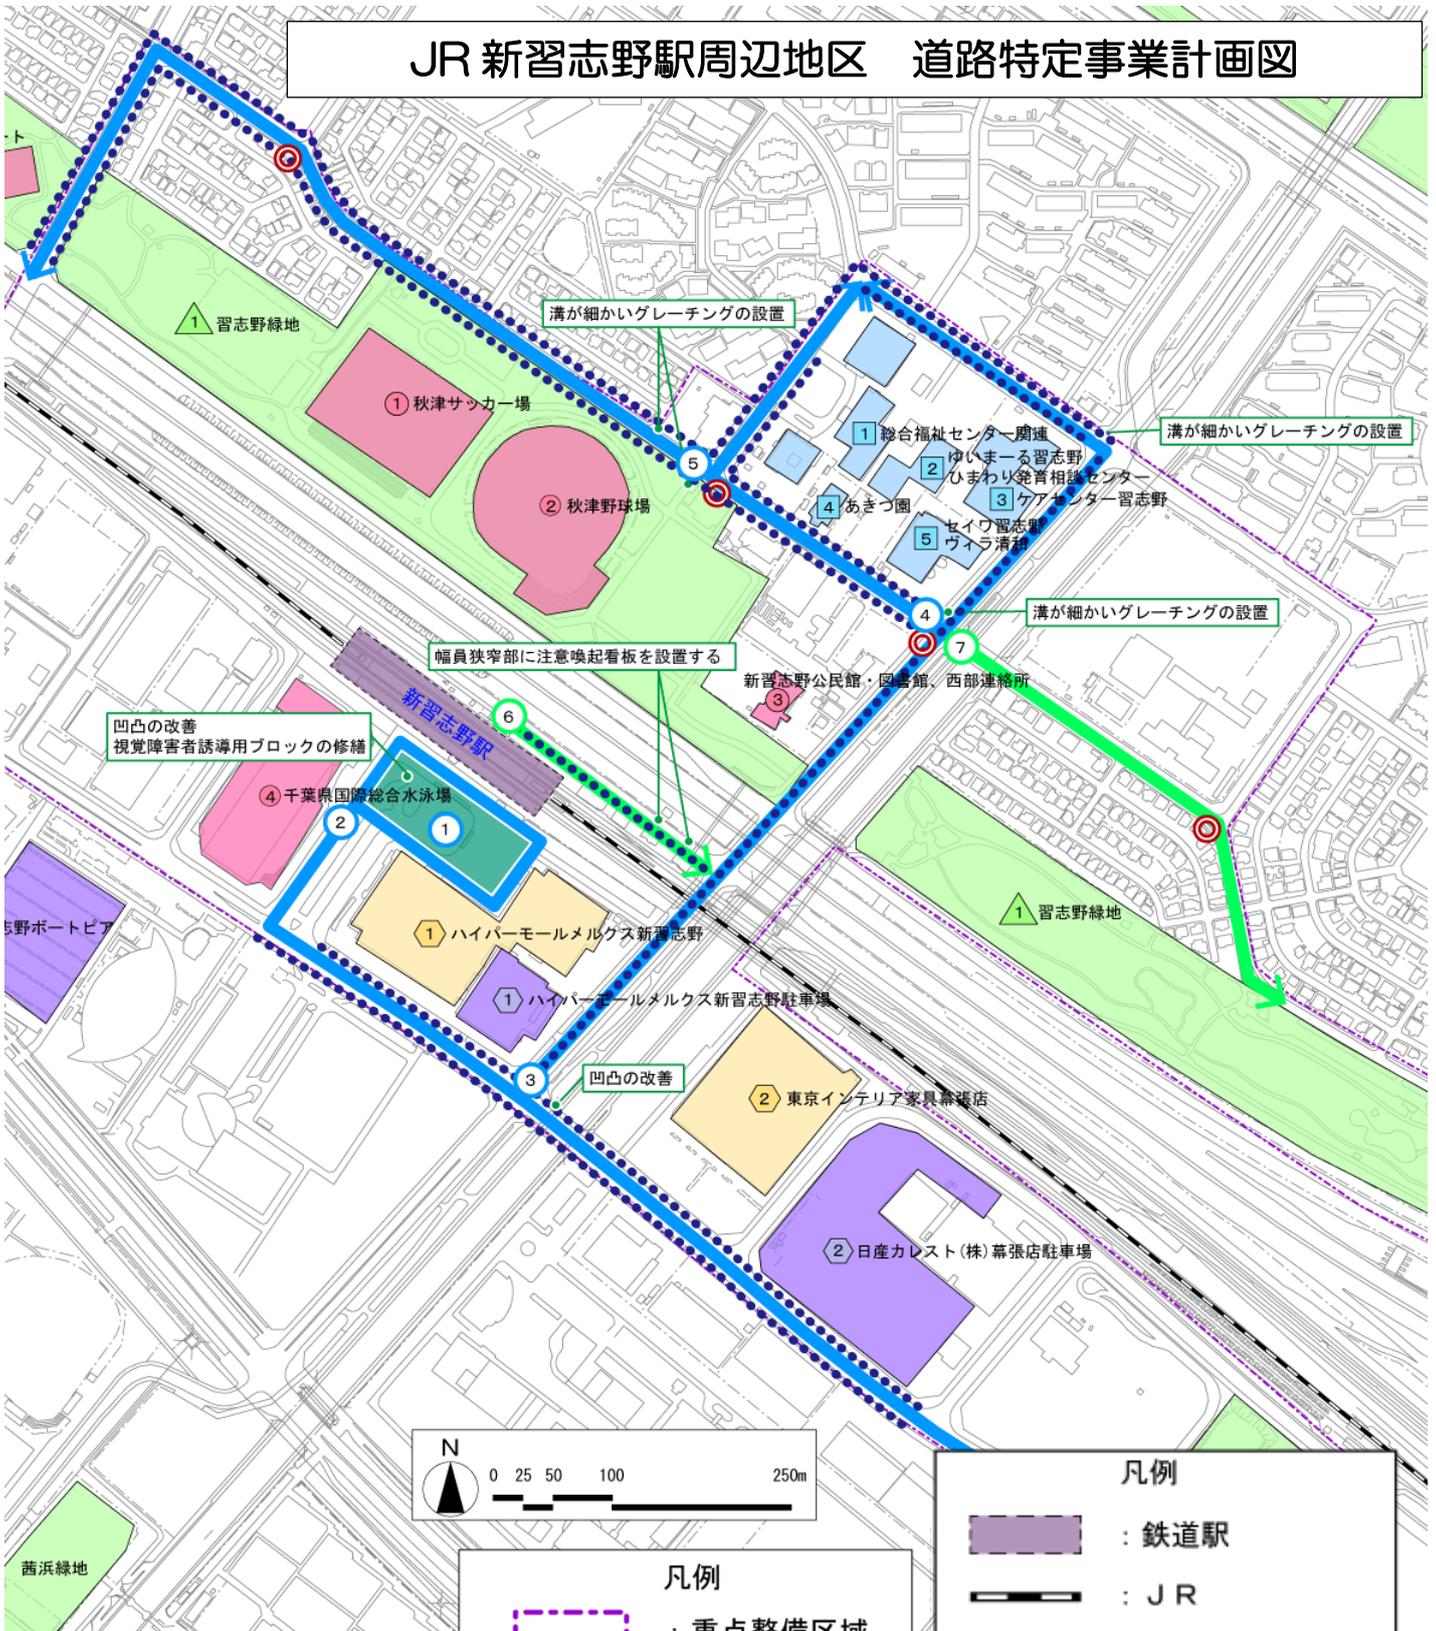

凡例	
	: 重点整備区域
	: 生活関連経路
	: 準生活関連経路

< 道路特定事業の凡例 >

- : 歩道の改良 (部分)
- : 視覚障害者誘導用ブロックの設置
- : その他整備

凡例	
	: 鉄道駅
	: JR
	: その他の鉄道
	: 市境
	: 公共施設
	: 福祉・医療施設
	: 商業施設
	: 駐車場
	: 公園

No.	重点整備地区	路線番号	事業区間		事業者	事業内容	事業量 (延長/箇所数)	特定事業計画での 実施予定時期		実施時期 (年度)							令和6年度の具体的な 取組内容及び課題					
			始点	終点				着手 予定	完了 予定	前期					後期							
										27	28	29	30	元	2	3		4	5	6	7	
55	ハ	5	秋津野球場前	習志野緑地前	習志野市 (街路建設課)	歩道の改良(部分)	16箇所	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	令和7年度以降に実施していく予定		
56	ハ					溝が細かいグレーチングの設置	2箇所	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	令和7年度以降に実施していく予定	
57	ハ					視覚障害者誘導用ブロックの連続設置 及び設置見直し	1,530m	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	令和7年度以降に実施していく予定
58	ハ				習志野市 (道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D	A	A		定期的な市内パトロール実施	
58	ハ				習志野市 (防犯安全課)	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		整理地区域外のため放置自転車等の連絡があった場合に職員が撤去
59	ハ	6	JR新習志野駅北口	香澄交差点歩道橋	国土交通省	幅員狭窄部に注意喚起看板を設置する	2基	前期	前期	—	A	B	B	B	A	A	A	A				
60	ハ					視覚障害者誘導用ブロックを設置する	200m	前期	前期	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
61	ハ					歩きやすい歩行空間を維持するための 継続的な改善を行う	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
62	ハ	7	セイワ習志野前	習志野緑地前	習志野市 (道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D	A	A	定期的な市内パトロール実施		
62	ハ				習志野市 (防犯安全課)	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		整理地区域外のため放置自転車等の連絡があった場合に職員が撤去
63	ハ				習志野市 (街路建設課)	歩道の改良(部分)	10箇所	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	令和7年度以降に実施していく予定
