


JR 津田沼駅・新京成新津田沼駅周辺地区 道路特定事業計画図（1/2）

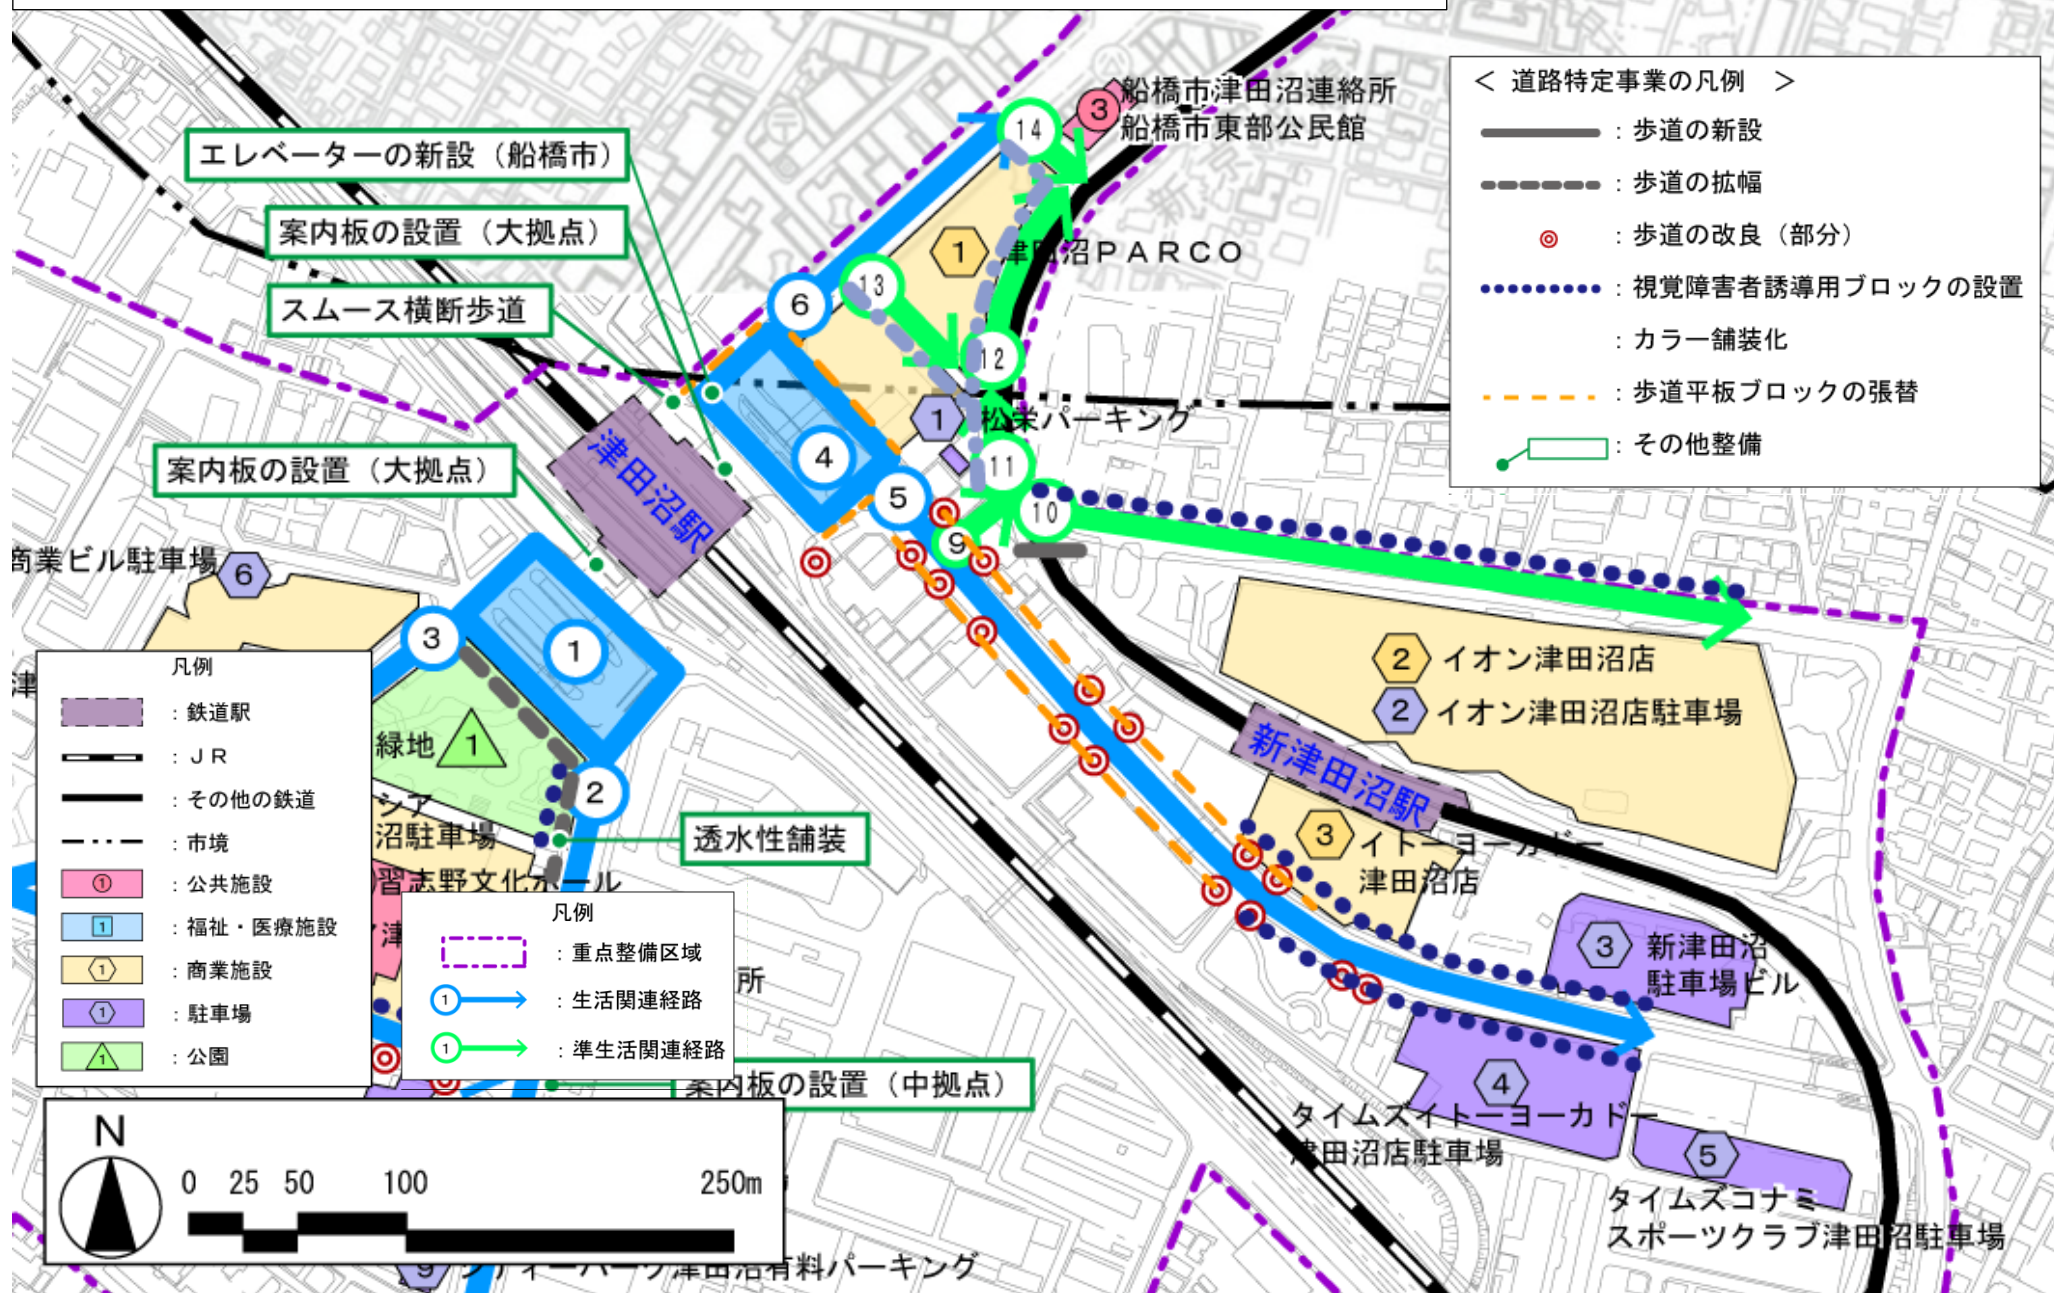

JR 津田沼駅・新京成新津田沼駅周辺地区 道路特定事業計画図 (2/2)

< 道路特定事業の凡例 >

- : 歩道の新設
- - - : 歩道の拡幅
- ⊙ : 歩道の改良 (部分)
- : 視覚障害者誘導用ブロックの設置
- : カラー舗装化
- - - : 歩道平板ブロックの張替
- : その他整備



習志野市バリアフリー移動等円滑化特定事業計画進捗状況調査表(道路特定事業計画)

A:事業完了・計画どおり進行
B:概ね計画どおり進行
C:進捗しているが努力を要する
D:未着手
—:計画実施時期未到来

＜JR津田沼駅・新京成新津田沼駅周辺地区＞

No.	重点整備 地区	路線 番号	事業区間		事業者	事業内容	事業量 (延長/箇所数)	特定事業計画での 実施予定時期		実施時期 (年度)														令和7年度の具体的な 取組内容及び課題		
			始点	終点				前期							後期											
								着手 予定	完了 予定	27	28	29	30	元	2	3	4	5	6	7						
1	イ	1	JR津田沼駅南口 駅前広場	JR津田沼駅南口 駅前広場	習志野市 (道路つくる課)	歩道の拡幅(津田沼公園北側)	96m	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	JR津田沼駅南口再開発にあわせて整備予定		
2	イ				案内板の設置(大拠点)	1箇所	前期	前期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	JR津田沼駅南口再開発にあわせて整備予定	
3	イ				習志野市 (道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	定期的な市内パトロール実施
3	イ				習志野市 (くらし安全課)	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	JR津田沼駅南口 撤去台数 自転車:62 原付:2
4	イ	2	JR津田沼駅南口 駅前広場	習志野郵便局前	習志野市 (道路つくる課)	歩道の拡幅(津田沼公園東側)	44m	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	JR津田沼駅南口再開発にあわせて整備予定		
5	イ					視覚障害者誘導用ブロックの設置	200m	前期	前期	—	—	—	C	C	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	イ					案内板の設置	中拠点1箇所 小拠点1箇所	前期	前期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	JR津田沼駅南口再開発にあわせて整備予定	
7	イ	3	JR津田沼駅南口 駅前広場	Loharu 津田沼前	習志野市 (道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D	A	A	A	A	A	A	定期的な市内パトロール実施		
7	イ				習志野市 (くらし安全課)	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	JR津田沼駅南口 撤去台数 自転車:62 原付:2	
8	イ	4	JR津田沼駅北口 駅前広場	JR津田沼駅北口 駅前広場	習志野市 (道路つくる課)	歩道の改良(部分)	1箇所	前期	前期	C	C	C	C	C	C	A	/	/	/	/	/	/	/			
9	イ					歩道平板ブロックの張替	800㎡	前期	前期	C	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	イ					案内板の設置(大拠点)	1箇所	前期	前期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	JR津田沼駅南口再開発にあわせて整備予定
12	イ					スムーズ横断歩道	1箇所	前期	前期	—	C	C	C	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	イ				習志野市 (道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	定期的な市内パトロール実施
11	イ				習志野市 (くらし安全課)	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	JR津田沼駅北口 撤去台数 自転車:328 原付:7
13	イ					船橋市	エレベーターの設置	1基	前期	前期			D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	A		令和7年3月25日に令和7年度及び令和8年度におけるJR津田沼駅北口駅前広場エレベーター施設設置に伴う施行協定書を締結し、習志野市が行った詳細設計の費用負担を行った。	
13	イ					習志野市 (道路つくる課)	エレベーターの設置	1基	前期	前期			D	D	D	D	D	D	D	D	C	B	A		詳細設計を実施。工場製作および工事を前倒しで開始した。	
14	イ	5	JR津田沼駅北口 駅前広場	イトーヨーカドー 津田沼店前	習志野市 (道路つくる課)	歩道の改良(部分)	15箇所	前期	前期	C	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
15	イ					歩道平板ブロックの張替	2,200㎡	前期	前期	B	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	イ					視覚障害者誘導用ブロックの設置	550m	前期	前期	C	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	イ				習志野市 (道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	定期的な市内パトロール実施
17	イ				習志野市 (くらし安全課)	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	JR津田沼駅北口 撤去台数 自転車:328 原付:7


京成津田沼駅周辺地区 道路特定事業計画図

< 道路特定事業の凡例 >

-  : 歩道の改良（部分）
-  : その他整備

- 凡例
-  : 重点整備区域
 -  : 生活関連経路
 -  : 準生活関連経路

- 凡例
-  : 鉄道駅
 -  : JR
 -  : その他の鉄道
 -  : 市境
 -  : 公共施設
 -  : 福祉・医療施設
 -  : 商業施設
 -  : 駐車場
 -  : 公園



京成津田沼駅

① 庁舎分室（サンロード津田沼）

2

案内板の設置（大拠点）

凡例

-  : 重点整備区域
-  : 生活関連経路
-  : 準生活関連経路

凡例

-  : 鉄道駅
-  : JR
-  : その他の鉄道
-  : 市境
-  : 公共施設
-  : 福祉・医療施設
-  : 商業施設
-  : 駐車場
-  : 公園

2 習志野第一病院

案内板の設置（中拠点）

② 習志野市庁舎

旧庁舎


③ 保健会館
津田沼・鷺沼高齢者相談センター
① 急病診療所

習志野市バリアフリー移動等円滑化特定事業計画進捗状況調査表(道路特定事業計画)

<京成津田沼駅周辺地区>

No.	重点整備 地区	路線 番号	事業区間		事業者	事業内容	事業量 (延長/箇所数)	特定事業計画での 実施予定時期		実施時期 (年度)											令和7年度の具体的な 取組内容及び課題		
			始点	終点				前期										後期					
								着手 予定	完了 予定	27	28	29	30	元	2	3	4	5	6	7			
35	□	1	京成津田沼駅 南口駅前広場	新庁舎前	習志野市 (道路つくる課)	案内板の設置(中拠点)	1箇所	前期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	旧庁舎跡地利用 3・3・3号線鷺沼区画整理後実施予定		
37	□						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
36	□				習志野市 (道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D	A	A	A	定期的な市内パトロール実施		
36	□				習志野市 (くらし安全課)	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	京成津田沼駅 撤去台数 自転車:74 原付:0		
38	□	2	京成津田沼駅 南口駅前広場	—	習志野市 (道路つくる課)	案内板の設置(大拠点)	1箇所	前期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	旧庁舎跡地利用 3・3・3号線鷺沼区画整理後実施予定			
39	□				習志野市 (道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D	A	A	A	定期的な市内パトロール実施		
39	□				習志野市 (くらし安全課)	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	京成津田沼駅 撤去台数 自転車:74 原付:0		
40	□	3	習志野第一病院	保健会館 (移転前)	習志野市 (道路つくる課)	歩道の改良(部分)	2箇所	前期	前期	—	—	—	—	—	—	/	/	/	/	/			
41	□				習志野市 (道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D	A	A	A	定期的な市内パトロール実施		
41	□				習志野市 (くらし安全課)	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	整理区域外のため放置自転車等の連絡があった 場合に職員が撤去		

JR 新習志野駅周辺地区 道路特定事業計画図

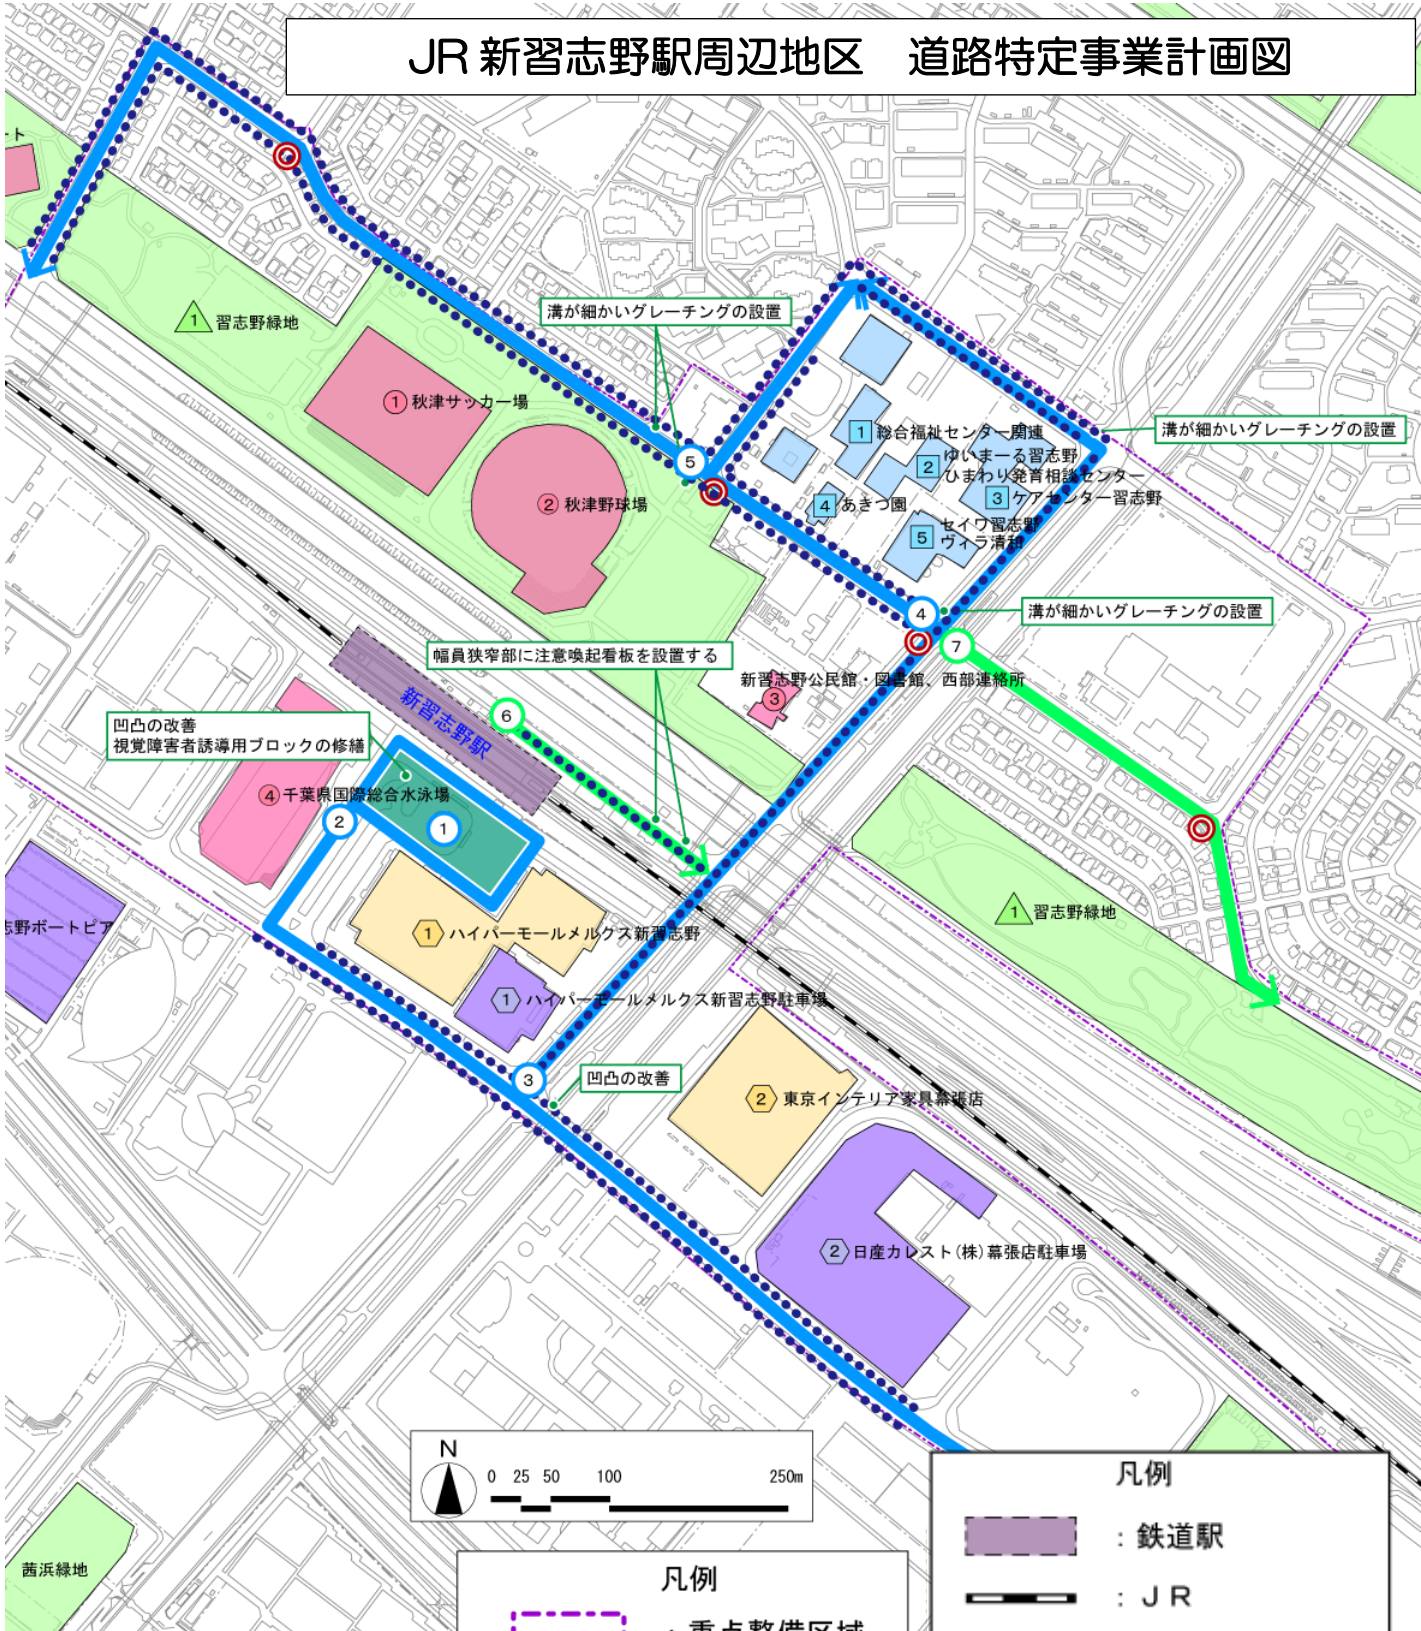

＜ 道路特定事業の凡例 ＞

◎：歩道の改良（部分）

.....：視覚障害者誘導用ブロックの設置

■：その他整備

凡例

：重点整備区域

：生活関連経路

：準生活関連経路

凡例

-  : 鉄道駅
-  : J R
-  : その他の鉄道
-  : 市境
-  : 公共施設
-  : 福祉・医療施設
-  : 商業施設
-  : 駐車場
-  : 公園

— • —

①

1



習志野市バリアフリー移動等円滑化特定事業計画進捗状況調査表(道路特定事業計画)

<新習志野駅周辺地区>

No.	重点整備 地区	路線 番号	事業区間		事業者	事業内容	事業量 (延長/箇所数)	特定事業計画での 実施予定時期		実施時期 (年度)														令和7年度の具体的な 取組内容及び課題
			始点	終点				着手 予定	完了 予定	前期							後期							
										27	28	29	30	元	2	3	4	5	6	7				
42	ハ	1	JR新習志野駅 南口駅前広場	JR新習志野駅 南口駅前広場	習志野市 (道路つくる課)	凹凸の改善(部分・東日本大震災の復旧)	凹凸部分の復旧	平成28年度 以降	前期	—	—	—	—	—	—	—	—	A	/	/				
43	ハ				視覚障害者誘導用ブロックの修繕 (東日本大震災の復旧)	—	平成28年度 以降	前期	—	—	—	—	—	—	—	A	/	/						
44	ハ				習志野市 (道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D	A	A	A				
44	ハ				習志野市 (くらし安全課)	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
45	ハ	2	JR新習志野駅 南口駅前広場	芝園公園前	習志野市 (道路つくる課)	凹凸の改善(部分・東日本大震災の復旧)	凹凸部分の復旧	平成28年度 以降	後期	—	—	—	—	—	—	—	—	A	/	/				
46	ハ				視覚障害者誘導用ブロックの設置	1,270m	平成28年度 以降	後期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
47	ハ				習志野市 (道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D	A	A	A	A			
47	ハ				習志野市 (くらし安全課)	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
48	ハ	3	ミスターマックス 新習志野前	総合福祉センター 関連前	習志野市 (道路つくる課)	歩道の改良(部分)	10箇所	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	B	B	D	D				
49	ハ				習志野市 (道路つくる課)	溝巾が細かいグレーチングの設置	2箇所	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	A	A	/	/				
50	ハ				習志野市 (道路つくる課)	視覚障害者誘導用ブロックの設置	1,210m	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	B	B	D	—				
51	ハ				習志野市 (道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D	A	A	A	A			
51	ハ				習志野市 (くらし安全課)	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
52	ハ	4	セイワ習志野前	総合福祉センター 関連前	習志野市 (道路つくる課)	視覚障害者誘導用ブロックの設置	740m	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—	B	D	—				
54	ハ				習志野市 (道路つくる課)	歩道の改良(部分)	5箇所	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
53	ハ				習志野市 (道路管理課)	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D	A	A	A	A	A		
53	ハ				習志野市 (くらし安全課)	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

[illegible]
