
報告第1号

東日本大震災の被害状況について

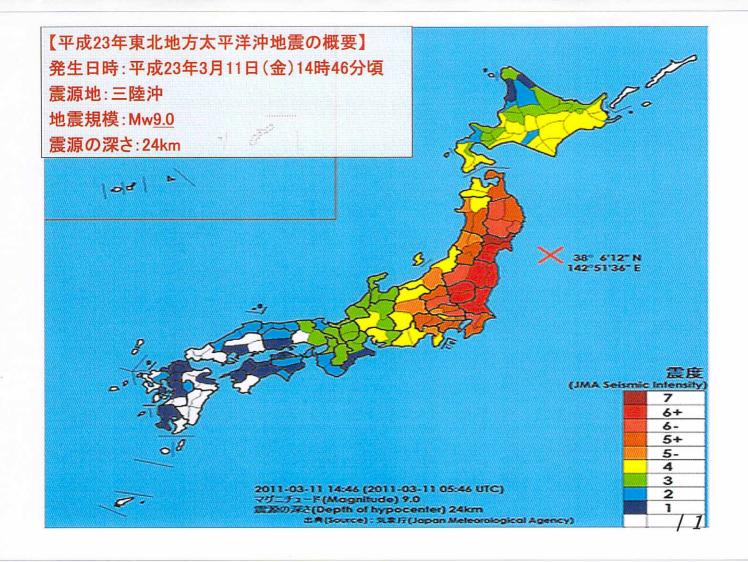

習志野市の被害状況

H24.2.29現在

| HINTI | H24.2.29現在 | | |
|--------------|---|---|--|
| 震度 | 習志野市鷺沼:5強(市役所本庁舎横震度計) 震度計感知時刻:午後2時47分32秒 | | |
| 家屋被害 | ① 全壊 ② 大規模半壊 ③ 半壊 ④ 一部損壊 | 9件 176件 537件 4,505件 | |
| 火災 | ① 出火件数 ② 焼失数 | 1件 1棟 | |
| 人的被害 | ① 死者 ② 負傷者 | 1人 6人(うち重傷1人) | |
| 避難者 帰宅困難者 | 避難所 保育所帰宅困難児童 放課後児童会 | 2,953人(12ケ所開設) 191人(14保育所、1こども園) 8人(5児童会) | |
| 液状化現象 | 埋め立て地区を中心に各地で発生 断水、下水道管破損、道路隆起・陥没、ガス漏れ・漏水等多数発生 | | |

| 庁舎 | 〇本庁舎ガラス破損、柱、梁、壁、床にヒビ等多数発生 〇耐震性がIS値0.42から0.30へ低下 | | |
|--------------------|--|--|--|
| 市立幼稚園・ 保育所・こども園 | 〇敷地内地盤被害••• <mark>8</mark> 園所 〇建物被害••• <mark>5</mark> 園 | | |
| 市立小中学校 | ○敷地内地盤被害・・・8校○体育館損傷・・・3校○プール損傷・・・3校○校舎被害・・・ヒビ等発生 | | |
| 環境施設 | ○公園等:橋の継ぎ目剥離、雨水パイプ破損、液状化、 地割れ、陥没等多数 ○谷津干潟自然観察センター: 受水槽給水パイプ破損、機器水没、通行用橋の隆起 、液状化による泥の流出、西側天井窓に亀裂等 | | |
| 社会教育施設 | ○習志野文化ホール: 天井落下 ○3公民館、旧鴇田家住宅: 液状化、地盤沈下 | | |
| その他施設 | 〇12スポーツ施設:液状化、地盤沈下 〇海浜霊園:墓石被害360基、土砂の堆積、陥没ひび割れ | | |


/ 3

ライフライン被害状況

| 区分 | 平成23年3月22日までの被災状況 | | |
|-----|---|--|--|
| 電気 | 一時停電地区発生 | | |
| ガス | ガス臭、マイコン復帰等 約 <mark>700件</mark> | | |
| 上水道 | 断水約5,400戸 赤水、漏水、問い合わせ等約1,600件 | | |
| 下水道 | ○排水不良区域:約500ha(国道14号以南の香澄・秋津・袖ケ浦・谷津地区)※下水道管が土砂で埋まった地区 約50ha(約1,500戸)○緊急的に菊田川へ放流。簡易処理施設を設置する。 | | |
| 道路 | 道路 〇通行支障 ・液状化現象により土砂堆積(国道14号以南の地域) ・隆起、陥没 172路線 ・車両通行止め 6ケ所 袖ケ浦 3ケ所 香澄、津田沼、谷津 各1ケ所 | | |

家屋被害図

- ◆ 香澄・袖ヶ浦・谷津3丁目地区で被害が大きい
- ◆ 14号線以北においても一部被害が大きい箇所が発生

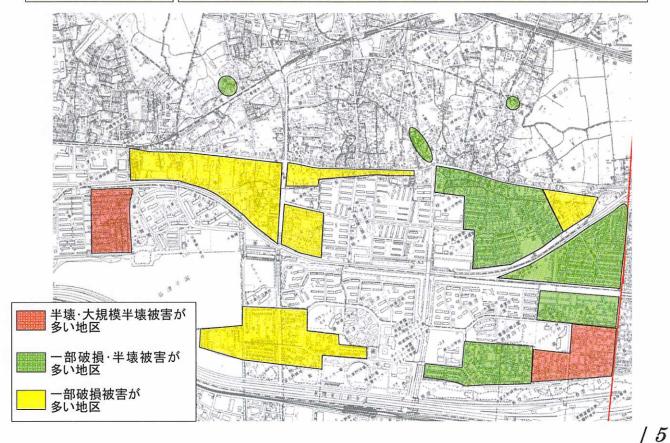


被害状況(液状化現象による道路被害)

香澄地区 砂に埋まった車両



香澄地区 道路の液状化

被害状況(液状化現象による隆起・陥没)





袖ヶ浦地区 道路の隆起

被害状況(構造物被害)



香澄地区 倒れたブロック塀と交通標識

被害状況(構造物被害)

袖ヶ浦地区 埋没した電柱



芝園地区 崩落した菊田川護岸

/ 9

被害状況(交通被害)

帰宅困難者(JR津田沼駅) バスやタクシーを待つ人々



香澄地区 通行不能となった道路





校舎内構造物落下

被害状況(庁舎被害)



天井のひずみ

被害状況(公共施設)


海浜霊園の液状化状況






旧鴇田家住宅の地盤被害

/ 13

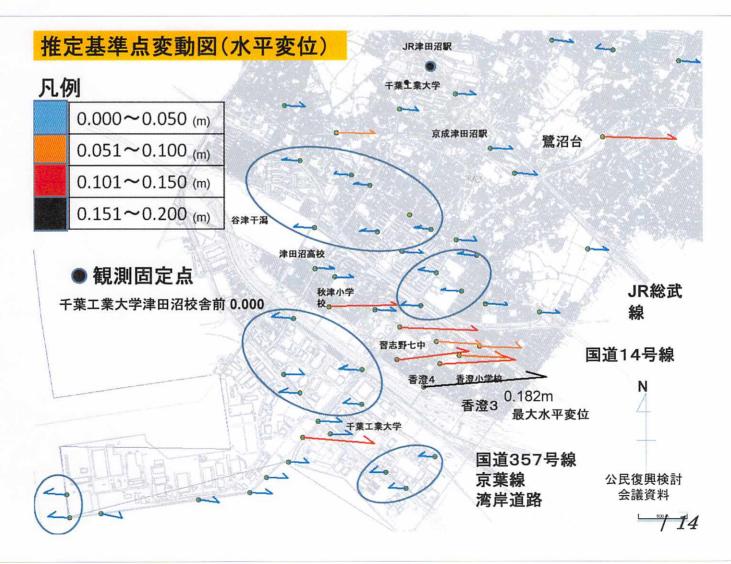

下水道施設被害状況図(国道14号以南)

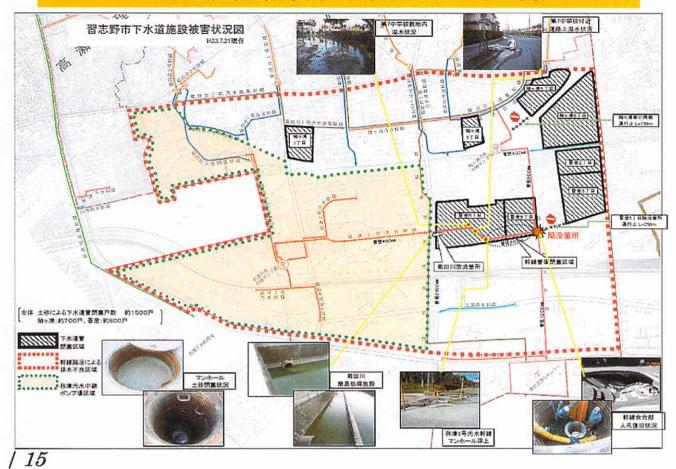

下水道施設被害状況表(本管・マンホール)

○都市災害復旧事業

平成23年7月8日現在

| | 汚水管 | 雨水管 | マンホール |
|------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 埋立地区 全体 | 約60 k m | 約46km | 約2,900基 |
| 破損箇所 | 約3.4 k m | 約0.2 k m | 126基 |
| 管 径 | φ250 ~800 | φ1,000 ~1650 | 1号人孔~ 特殊人孔 |
| 管 種 | ヒューム管 塩 ビ 管 FRPM管 | ヒューム管 | 組立人孔 現場打人孔 |

※FRPM管とは、強化ブラスチック複合管といい、ガラス繊維と樹脂及び骨材を組み合わせた複合パイプ。 構造(断面)としては、内面、外面がガラス繊維で中間に樹脂モルタル層を入れたサンドイッチ構造。
