


習志野市鷺沼放流幹線建設工事 工事状況 令和3年10月末 進捗率61.3%

令和3年10月末現在

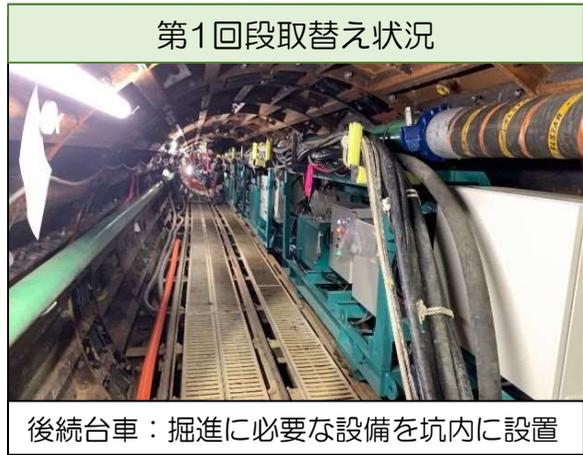

【イメージアップ看板設置】

- ・ 工事の概要、シールド工法について詳しく書いてありますので、ぜひご覧ください。

【シールド掘進】

- ・ シールドが22.5m掘進したので、第1回段取替えを行っています。
- ・ 急曲線仕様にマシンを改造し、掘進の準備を行っています。
