

習志野市鷺沼放流幹線建設工事その5 デュアルシールドマシン




立坑下 シールド機投入前



シールド機投入用120tクレーン搬入



シールド機前胴投入状況

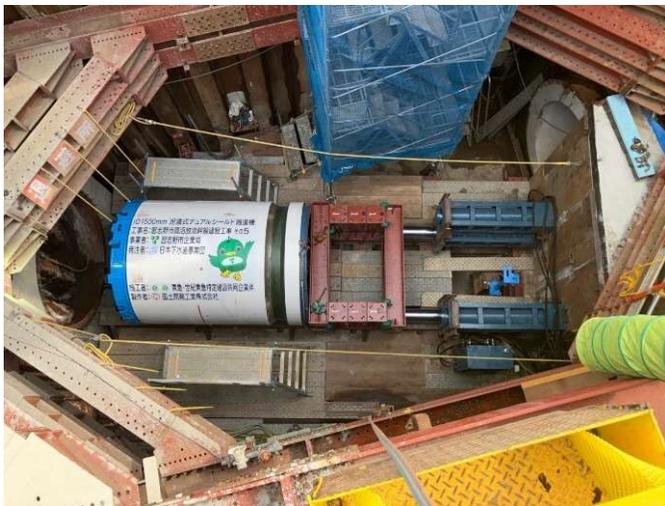

シールド機前胴投入完了



シールド機中胴組立状況



シールド機 後胴組立完了

下水管を掘る機械の搬入組立が完了しました。通常のシールドマシンとは異なり、発進から約100mまでは推進工法にて施工し、その後の急曲線部はシールドとして施工する工法です。
