JR 津田沼駅・新京成新津田沼駅周辺地区　道路特定事業計画図（1/2）

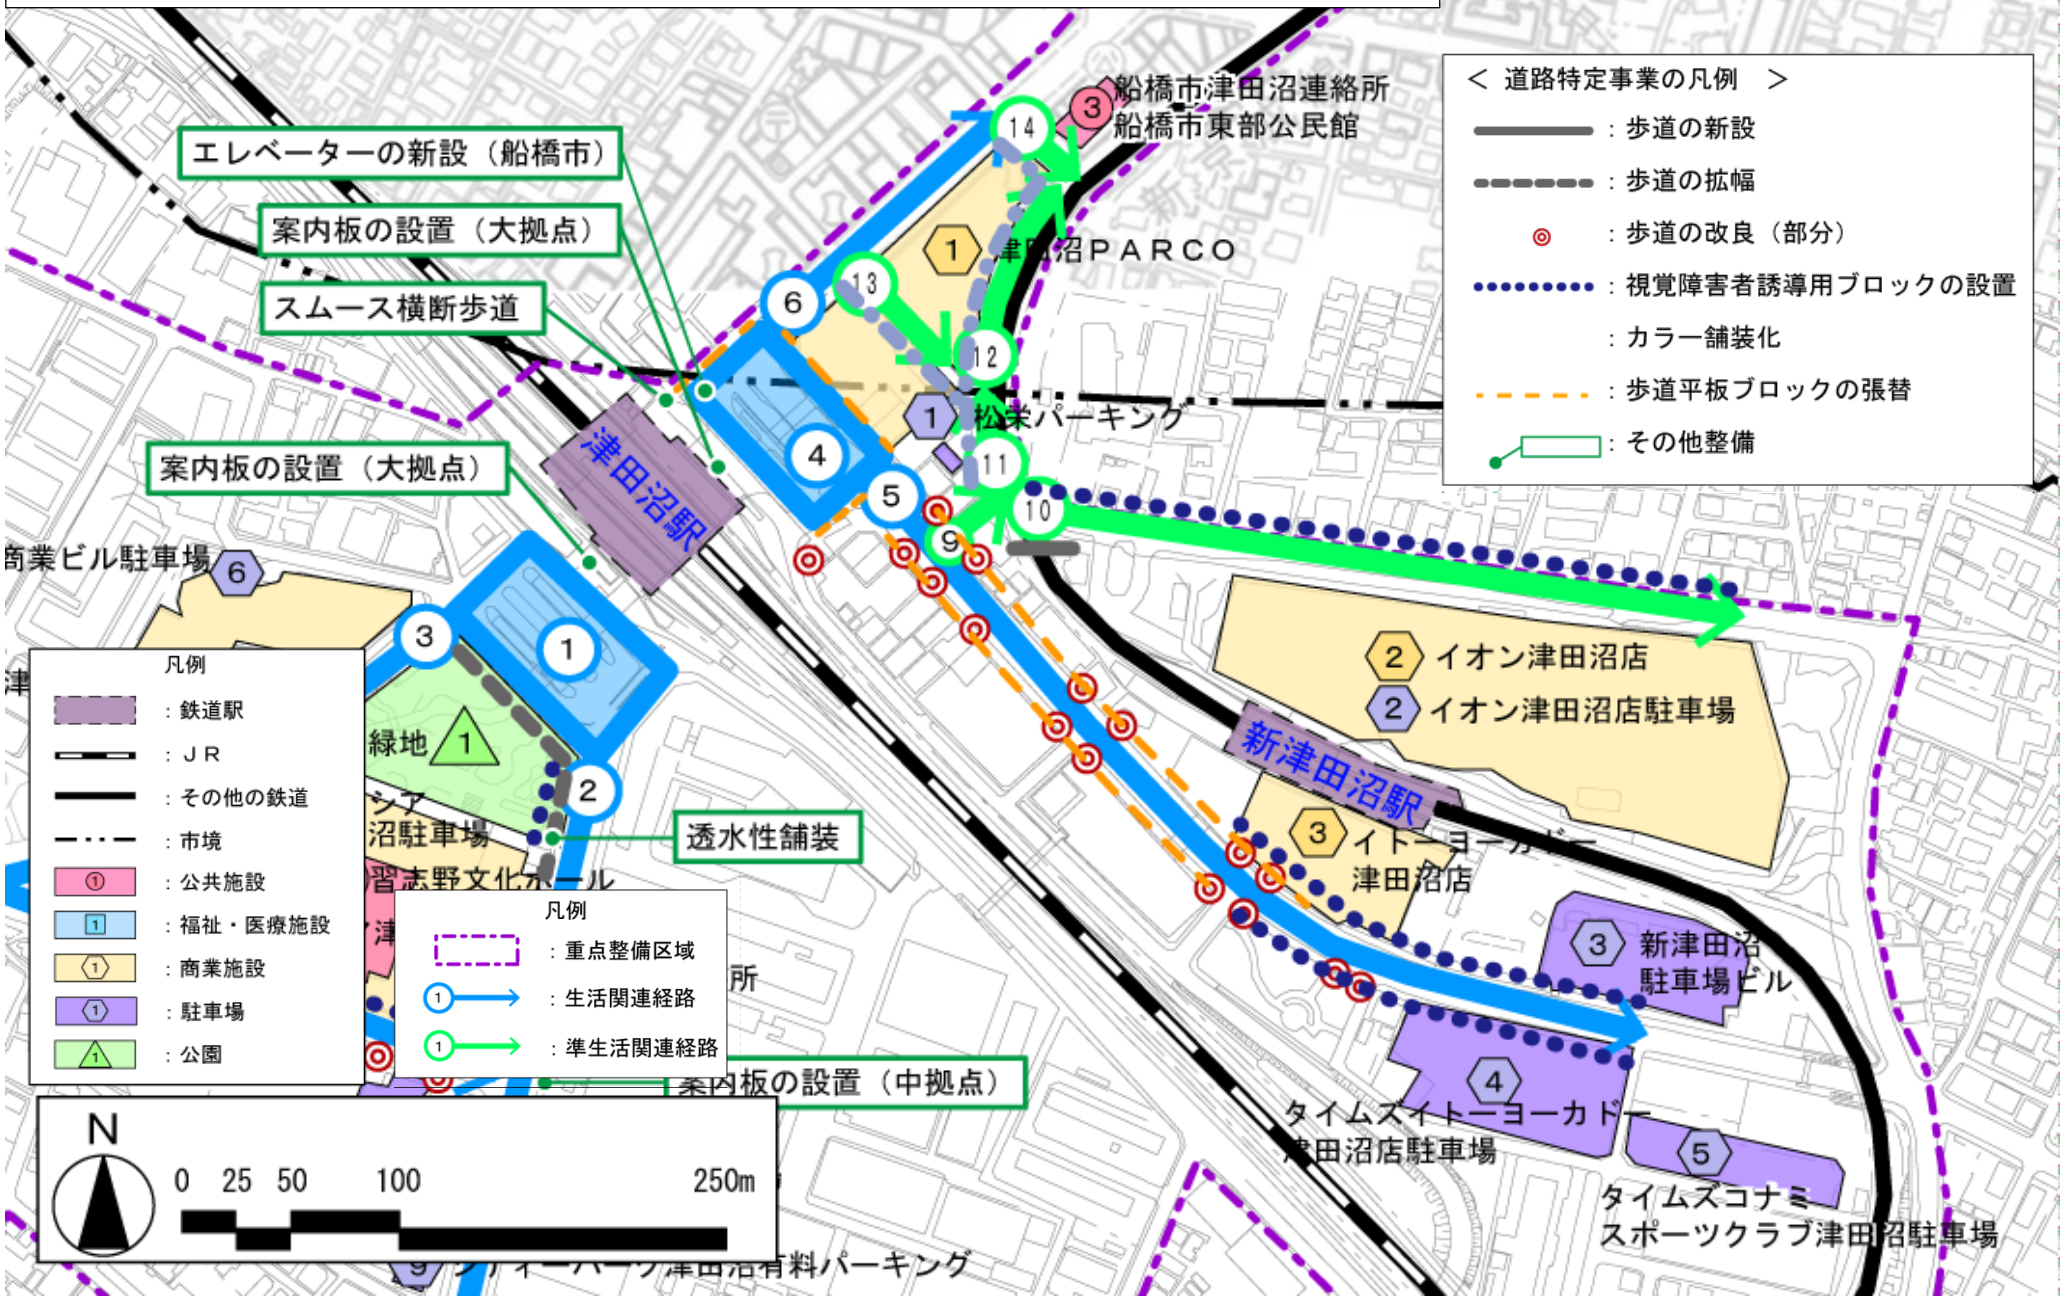

JR 津田沼駅・新京成新津田沼駅周辺地区　道路特定事業計画図（2/2）

習志野市バリアフリー移動等円滑化特定事業計画進捗状況調査表（道路特定事業計画）

A：事業完了・計画どおり進行
B：概ね計画どおり進行
C：進捗しているが努力を要する
D：未着手
—：計画実施時期未到来

＜JR津田沼駅・新京成新津田沼駅周辺地区＞

路線番号	事業区間 始点	事業区間 終点	事業者	事業内容	事業量（延長/箇所数）	特定事業計画での実施予定時期 着手予定	特定事業計画での実施予定時期 完了予定	実施時期（年度） 前期 27	28	29	30	元	2	後期 3	4	5	6	7	令和4年度の具体的な取組内容及び課題
1	JR津田沼駅南口駅前広場	JR津田沼駅南口駅前広場	習志野市（街路建設課）	歩道の拡幅（津田沼公園北側）	96m	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—				令和5年度以降に実施していく予定
				案内板の設置（大拠点）	1箇所	前期	前期	—	—	—	—	—	—	—	—				令和5年度以降に実施していく予定
			習志野市（道路管理課）	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D				新型コロナウィルス感染を予防する為、実施を見送った。
			習志野市（防犯安全課）	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A				JR津田沼駅南口　撤去台数 自転車　89台　バイク1台
2	JR津田沼駅南口駅前広場	習志野郵便局前	習志野市（街路建設課）	歩道の拡幅（津田沼公園東側）	44m	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—				令和5年度以降に実施していく予定
				視覚障害者誘導用ブロックの設置	200m	前期	前期	—	—	—	C	C	A						
				案内板の設置	中拠点1箇所 小拠点1箇所	前期	前期	—	—	—	—	—	—	—	—				令和5年度以降に実施していく予定
3	JR津田沼駅南口駅前広場	Loharu 津田沼前	習志野市（道路管理課）	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D				新型コロナウィルス感染を予防する為、実施を見送った。
			習志野市（防犯安全課）	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A				JR津田沼駅南口　撤去台数 自転車　89台　バイク1台
4	JR津田沼駅北口駅前広場	JR津田沼駅北口駅前広場	習志野市（街路建設課）	歩道の改良（部分）	1箇所	前期	前期	C	C	C	C	C	C	A					
				歩道平板ブロックの張替	800㎡	前期	前期	C	A										
				案内板の設置（大拠点）	1箇所	前期	前期	—	—	—	—	—	—	—	—				令和5年度以降に実施していく予定
				スムース横断歩道	1箇所	前期	前期	—	C	C	C	A							
			習志野市（道路管理課）	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D				新型コロナウィルス感染を予防する為、実施を見送った。
			習志野市（防犯安全課）	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A				JR津田沼駅北口　撤去台数 自転車　255台　バイク　11台
			船橋市	エレベーターの設置	1基	前期	前期	D	D	D	D	D	D	D	D				エレベーター設置に向け、地元との意見交換を行った。
5	JR津田沼駅北口駅前広場	イトーヨーカドー津田沼店前	習志野市（街路建設課）	歩道の改良（部分）	15箇所	前期	前期	C	A										
				歩道平板ブロックの張替	2,200㎡	前期	前期	B	A										
				視覚障害者誘導用ブロックの設置	550m	前期	前期	C	A										
			習志野市（道路管理課）	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D				新型コロナウィルス感染を予防する為、実施を見送った。
			習志野市（防犯安全課）	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A				JR津田沼駅北口　撤去台数 自転車　255台　バイク　11台

路線番号	事業区間		事業者	事業内容	事業量（延長/箇所数）	特定事業計画での実施予定時期		実施時期（年度）											令和4年度の具体的な取組内容及び課題
								前期						後期					
	始点	終点				着手予定	完了予定	27	28	29	30	元	2	3	4	5	6	7	
6	JR津田沼駅北口駅前広場	津田沼PARCO前	千葉県	歩きやすい歩行空間を維持するための継続的な改善を行う	―	継続		A	A	A	A	A	A	A	A				パトロールによる確認及び、修繕
				案内板の設置の検討	―	継続		―	―	―	―	―	―	―	―				周辺に県管理案内施設等が無いため、現在設置予定なし
7	Loharu 津田沼店前	習志野文化ホール前	習志野市（街路建設課）	歩道の改良（部分）	5箇所	前期	前期	―	―	―	―	―	―	―	―				令和5年度以降に実施していく予定
				視覚障害者誘導用ブロックの設置	187m	前期	前期	―	―	―	―	―	―	―	―				令和5年度以降に実施していく予定
			習志野市（道路課）	はみ出し看板の指導	―	継続		A	A	A	A	A	D	D	D				新型コロナウィルス感染を予防する為、実施を見送った。
			習志野市（防犯安全課）	放置自転車の撤去	―	継続		A	A	A	A	A	A	A	A				JR津田沼駅南口　撤去台数 自転車　89台　バイク1台
8	津田沼中央総合病院前	津田沼中央総合病院前	習志野市（街路建設課）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	15m	前期	前期	C	A										
			習志野市（道路管理課）	はみ出し看板の指導	―	継続		A	A	A	A	A	D	D	D				新型コロナウィルス感染を予防する為、実施を見送った。
			習志野市（防犯安全課）	放置自転車の撤去	―	継続		A	A	A	A	A	A	A	A				JR津田沼駅北口　撤去台数 自転車　255台　バイク　11台
9	三菱東京UFJ銀行前	―	習志野市（道路管理課）	はみ出し看板の指導	―	継続		A	A	A	A	A	D	D	D				新型コロナウィルス感染を予防する為、実施を見送った。
			習志野市（防犯安全課）	放置自転車の撤去	―	継続		A	A	A	A	A	A	A	A				JR津田沼駅北口　撤去台数 自転車　255台　バイク　11台
10	イオン津田沼店前	―	習志野市（街路建設課）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	326m	前期	前期	―	―	―	―	―	―	―	A				視覚障がい者誘導ブロックの設置 L=326m
			習志野市（道路管理課）	はみ出し看板の指導	―	継続		A	A	A	A	A	D	D	D				新型コロナウィルス感染を予防する為、実施を見送った。
			習志野市（防犯安全課）	放置自転車の撤去	―	継続		A	A	A	A	A	A	A	A				JR津田沼駅北口　撤去台数 自転車　255台　バイク　11台
11	三菱東京UFJ銀行前	津田沼PARCO前	習志野市（街路建設課）	カラー舗装化など	41m	前期	前期	―	―	―	―	―	A						
			習志野市（道路管理課）	はみ出し看板の指導	―	継続		A	A	A	A	A	D	D	D				新型コロナウィルス感染を予防する為、実施を見送った。
			習志野市（防犯安全課）	放置自転車の撤去	―	継続		A	A	A	A	A	A	A	A				JR津田沼駅北口　撤去台数 自転車　255台　バイク　11台
12	津田沼PARCO東側	―	船橋市	カラー舗装化	107m	前期	前期	D	D	D	C	C	A	A	A				外側線の設置、路肩部カラー舗装(緑色) 工事完了（令和2年度）
13	津田沼PARCO	―	船橋市	カラー舗装化	78m	前期	前期	D	D	D	C	C	A	A	A				外側線の設置、路肩部カラー舗装(緑色) 工事完了（令和2年度）
14	津田沼PARCO北側	―	船橋市	カラー舗装化	41m	前期	前期	D	D	D	C	C	A	A	A				外側線の設置、路肩部カラー舗装(緑色) 工事完了（令和2年度）
15	奏の杜フォルテ前	谷津近隣公園	習志野市（道路管理課）	はみ出し看板の指導	―	継続		A	A	A	A	A	D	D	D				新型コロナウィルス感染を予防する為、実施を見送った。
			習志野市（防犯安全課）	放置自転車の撤去	―	継続		A	A	A	A	A	A	A	A				整理地区域外のため放置自転車等の連絡があった場合に職員が撤去
			習志野市（街路建設課）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	280m	前期	前期	―	―	―	―	―	―	―	―				令和5年度以降に実施していく予定

京成津田沼駅周辺地区　道路特定事業計画図

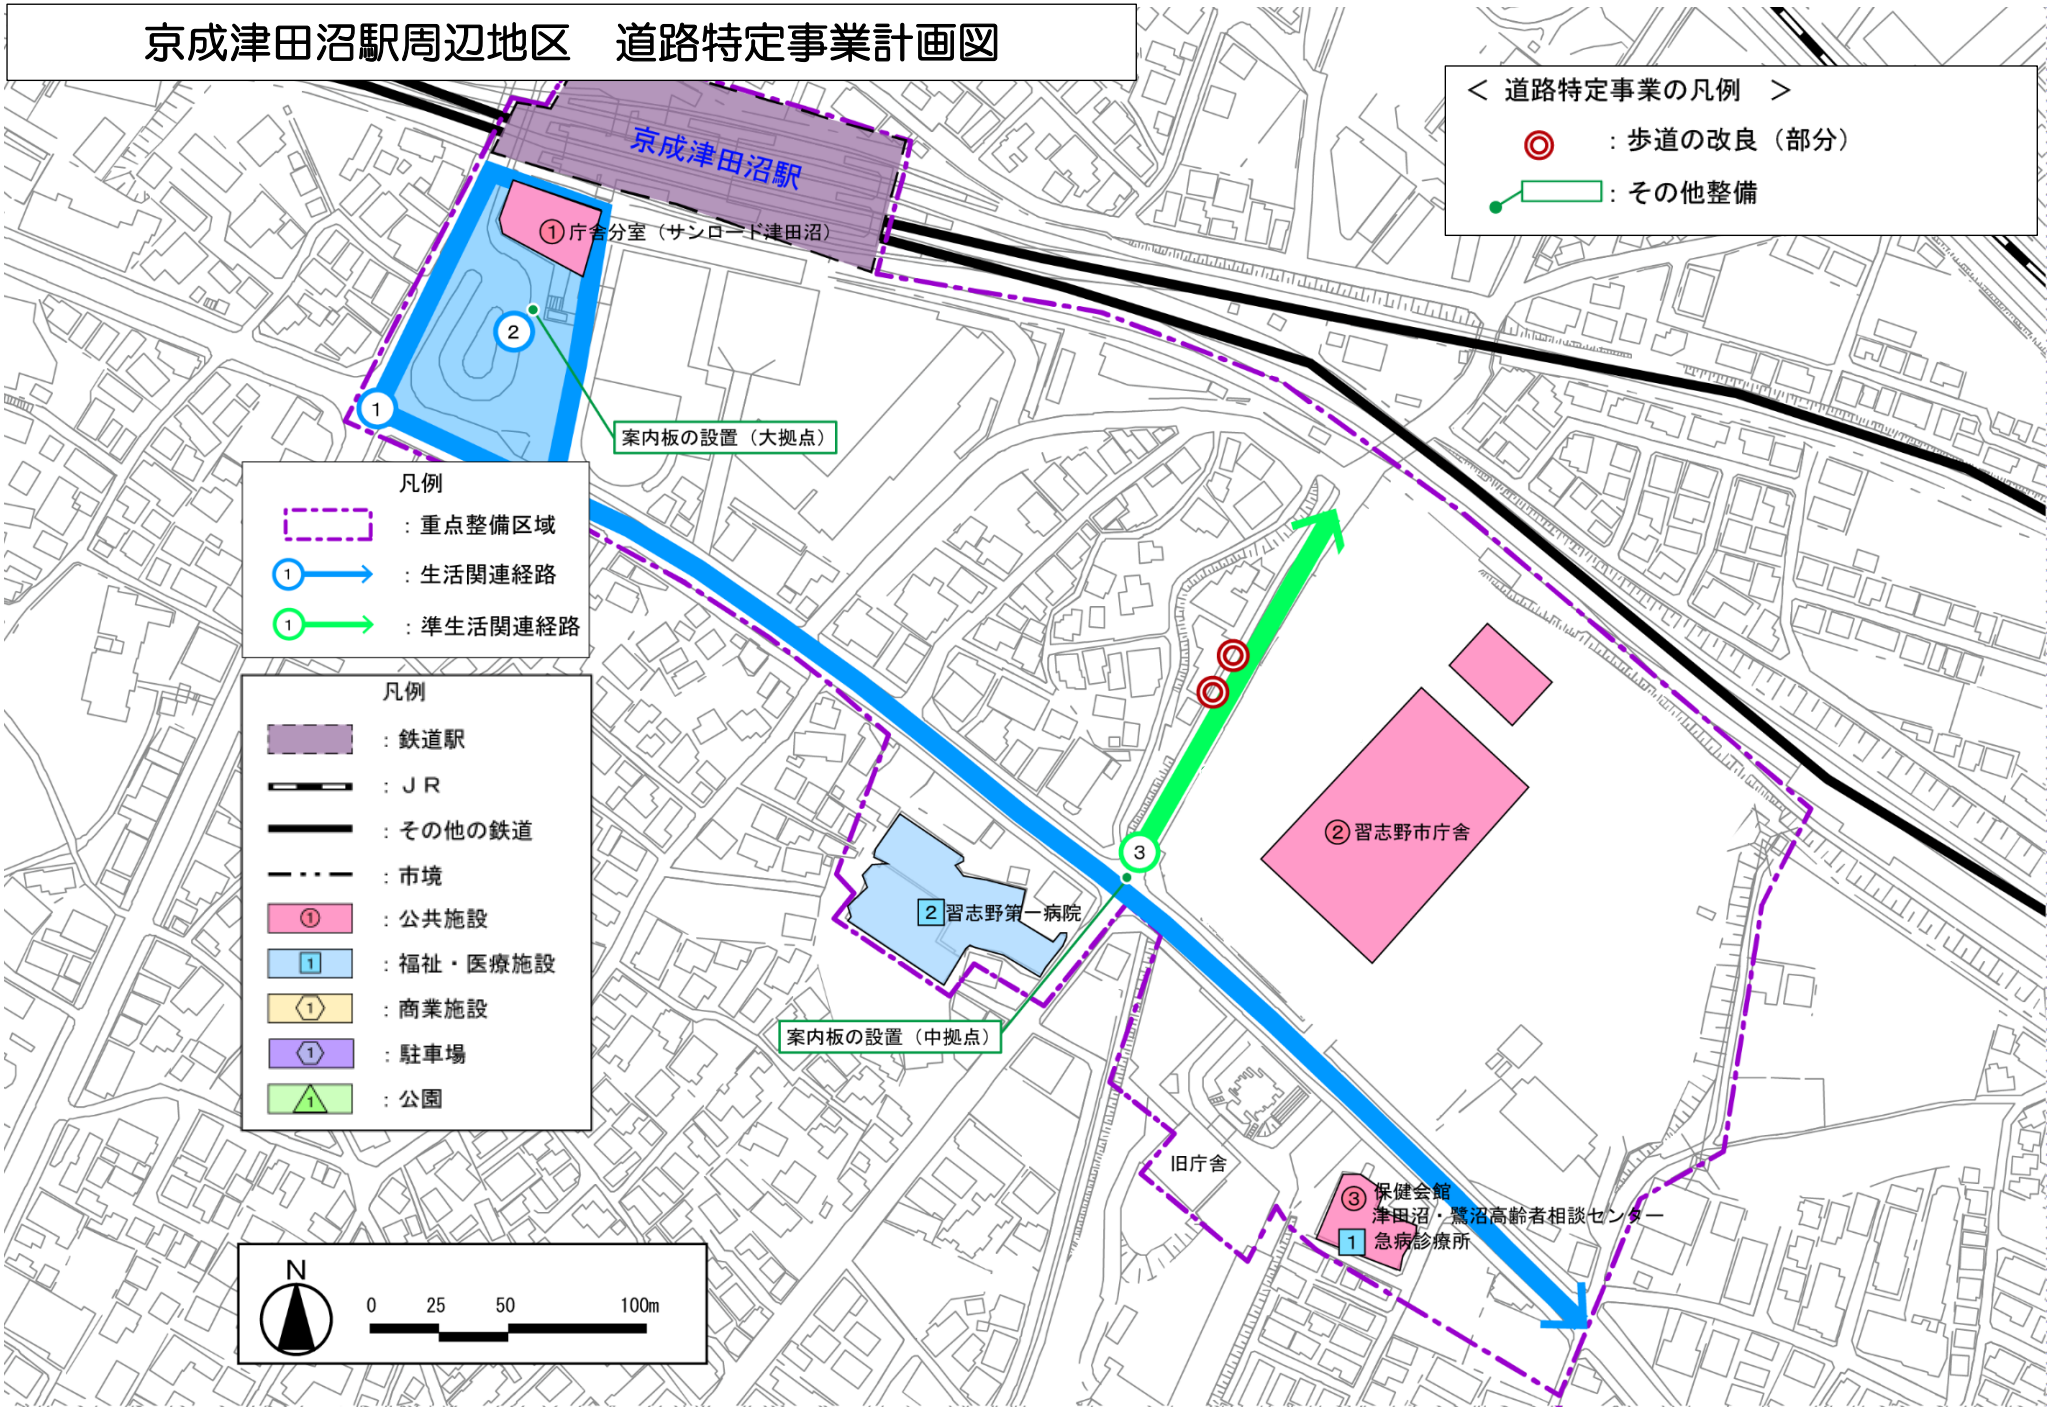

習志野市バリアフリー移動等円滑化特定事業計画進捗状況調査表（道路特定事業計画）

A：事業完了・計画どおり進行
B：概ね計画どおり進行
C：進捗しているが努力を要する
D：未着手
—：計画実施時期未到来

＜京成津田沼駅周辺地区＞

路線番号	事業区間		事業者	事業内容	事業量（延長/箇所数）	特定事業計画での実施予定時期		実施時期（年度）											令和4年度の具体的な取組内容及び課題
								前期						後期					
	始点	終点				着手予定	完了予定	27	28	29	30	元	2	3	4	5	6	7	
1	京成津田沼駅南口駅前広場	新庁舎前	習志野市（街路建設課）	案内板の設置（中拠点）	1箇所	前期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—				令和5年度以降に実施していく予定
				新庁舎建設の状況にあわせた歩道のバリアフリー整備															
			習志野市（道路管理課）	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D				新型コロナウィルス感染を予防する為、実施を見送った。
			習志野市（防犯安全課）	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A				京成津田沼駅　撤去台数 自転車　93台　バイク　5台
2	京成津田沼駅南口駅前広場	—	習志野市（街路建設課）	案内板の設置（大拠点）	1箇所	前期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—				令和5年度以降に実施していく予定
			習志野市（道路管理課）	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D				新型コロナウィルス感染を予防する為、実施を見送った。
			習志野市（防犯安全課）	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A				京成津田沼駅　撤去台数 自転車　93台　バイク　5台
3	習志野第一病院	保健会館（移転前）	習志野市（街路建設課）	歩道の改良（部分）	2箇所	前期	前期	—	—	—	—	—	—	—	—				令和5年度以降に実施していく予定
			習志野市（道路管理課）	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D				新型コロナウィルス感染を予防する為、実施を見送った。
			習志野市（防犯安全課）	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A				京成津田沼駅　撤去台数 自転車　93台　バイク　5台

JR 新習志野駅周辺地区　道路特定事業計画図

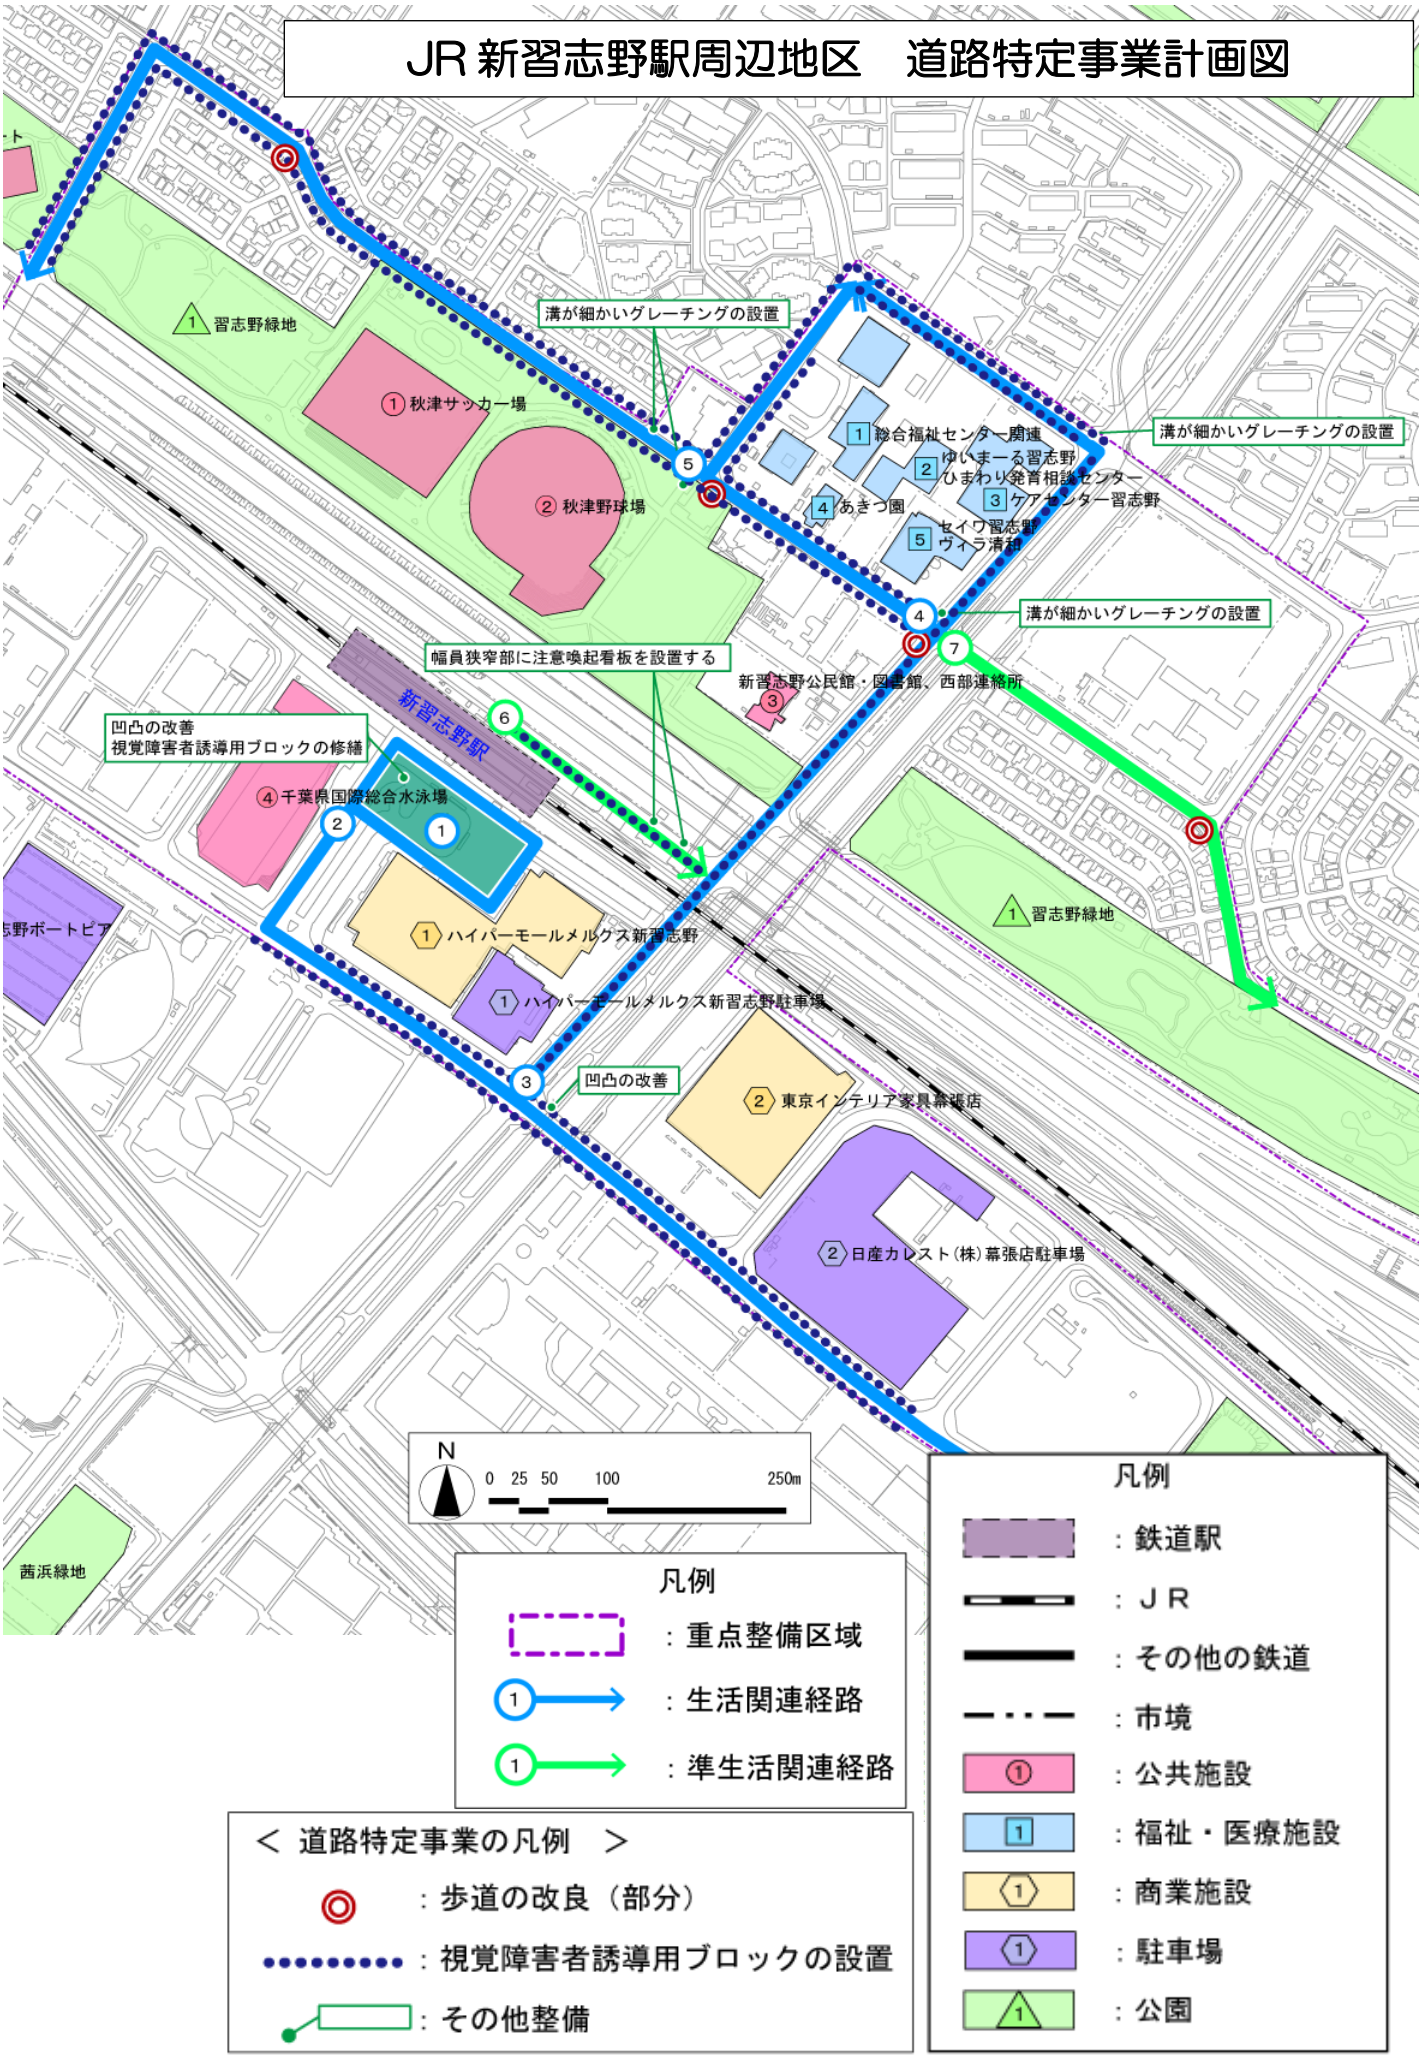

習志野市バリアフリー移動等円滑化特定事業計画進捗状況調査表（道路特定事業計画）

A：事業完了・計画どおり進行
B：概ね計画どおり進行
C：進捗しているが努力を要する
D：未着手
—：計画実施時期未到来

＜新習志野駅周辺地区＞

路線番号	事業区間 始点	事業区間 終点	事業者	事業内容	事業量（延長/箇所数）	特定事業計画での実施予定時期 着手予定	特定事業計画での実施予定時期 完了予定	実施時期（年度） 前期 27	28	29	30	元	2	後期 3	4	5	6	7	令和4年度の具体的な取組内容及び課題
1	JR新習志野駅南口駅前広場	JR新習志野駅南口駅前広場	習志野市（街路建設課）	凹凸の改善（部分・東日本大震災の復旧）	凹凸部分の復旧	平成28年度以降	前期	—	—	—	—	—	—	—	—				令和5年度以降に実施していく予定
				視覚障害者誘導用ブロックの修繕（東日本大震災の復旧）	—	平成28年度以降	前期	—	—	—	—	—	—	—	—				令和5年度以降に実施していく予定
			習志野市（道路管理課）	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D				新型コロナウィルス感染を予防する為、実施を見送った。
			習志野市（防犯安全課）	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A				新習志野駅　撤去台数 自転車　52台　バイク2台
2	JR新習志野駅南口駅前広場	芝園公園前	習志野市（街路建設課）	凹凸の改善（部分・東日本大震災の復旧）	凹凸部分の復旧	平成28年度以降	後期	—	—	—	—	—	—	—	—				令和5年度以降に実施していく予定
				視覚障害者誘導用ブロックの設置	1,270m	平成28年度以降	後期	—	—	—	—	—	—	—	—				令和5年度以降に実施していく予定
			習志野市（道路管理課）	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D				新型コロナウィルス感染を予防する為、実施を見送った。
			習志野市（防犯安全課）	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A				新習志野駅　撤去台数 自転車　52台　バイク2台
3	ミスターマックス新習志野前	総合福祉センター関連前	習志野市（街路建設課）	歩道の改良（部分）	10箇所	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	B				歩道改良を実施　4箇所 未整備箇所は令和5年度以降に実施していく予定
			習志野市（街路建設課）	溝巾が細かいグレーチングの設置	2箇所	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	A				グレーチング蓋細目を設置　2箇所
			習志野市（街路建設課）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	1,210m	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	B				視覚障がい者誘導用ブロックを設置　L=740m 未整備箇所は令和5年度以降に実施していく予定
			習志野市（道路管理課）	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D				新型コロナウィルス感染を予防する為、実施を見送った。
			習志野市（防犯安全課）	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A				新習志野駅　撤去台数 自転車　52台　バイク2台
4	セイワ習志野前	総合福祉センター関連前	習志野市（街路建設課）	視覚障害者誘導用ブロックの設置	740m	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—				令和5年度以降に実施していく予定
				歩道の改良（部分）	5箇所	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—				令和5年度以降に実施していく予定
			習志野市（道路管理課）	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D				新型コロナウィルス感染を予防する為、実施を見送った。
			習志野市（防犯安全課）	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A				整理地区域外のため放置自転車等の連絡があった場合に職員が撤去

No.	重点整備地区	路線番号	事業区間		事業者	事業内容	事業量（延長/箇所数）	特定事業計画での実施予定時期		実施時期（年度）											令和4年度の具体的な取組内容及び課題
										前期						後期					
			始点	終点				着手予定	完了予定	27	28	29	30	元	2	3	4	5	6	7	
55	ハ	5	秋津野球場前	習志野緑地前	習志野市（街路建設課）	歩道の改良（部分）	16箇所	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—				令和5年度以降に実施していく予定
56	ハ					溝が細かいグレーチングの設置	2箇所	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—				令和5年度以降に実施していく予定
57	ハ					視覚障害者誘導用ブロックの連続設置及び設置見直し	1,530m	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—				令和5年度以降に実施していく予定
58	ハ				習志野市（道路管理課）	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D				新型コロナウィルス感染を予防する為、実施を見送った。
58	ハ				習志野市（防犯安全課）	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A				整理地区域外のため放置自転車等の連絡があった場合に職員が撤去
59	ハ	6	JR新習志野駅北口	香澄交差点歩道橋	国土交通省	幅員狭窄部部に注意喚起看板を設置する	2基	前期	前期	—	A	B	B	B	A	A	A				
60	ハ					視覚障害者誘導用ブロックを設置する	200m	前期	前期	A											
61	ハ					歩きやすい歩行空間を維持するための継続的な改善を行う	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A				定期的なパトロールの実施
62	ハ	7	セイワ習志野前	習志野緑地前	習志野市（道路管理課）	はみ出し看板の指導	—	継続		A	A	A	A	A	D	D	D				新型コロナウィルス感染を予防する為、実施を見送った。
62	ハ				習志野市（防犯安全課）	放置自転車の撤去	—	継続		A	A	A	A	A	A	A	A				整理地区域外のため放置自転車等の連絡があった場合に職員が撤去
63	ハ				習志野市（街路建設課）	歩道の改良（部分）	10箇所	後期	後期	—	—	—	—	—	—	—	—				令和5年度以降に実施していく予定
